


Monteringsanvisning

Akkan attefallshus 30m²

Planlösning 1

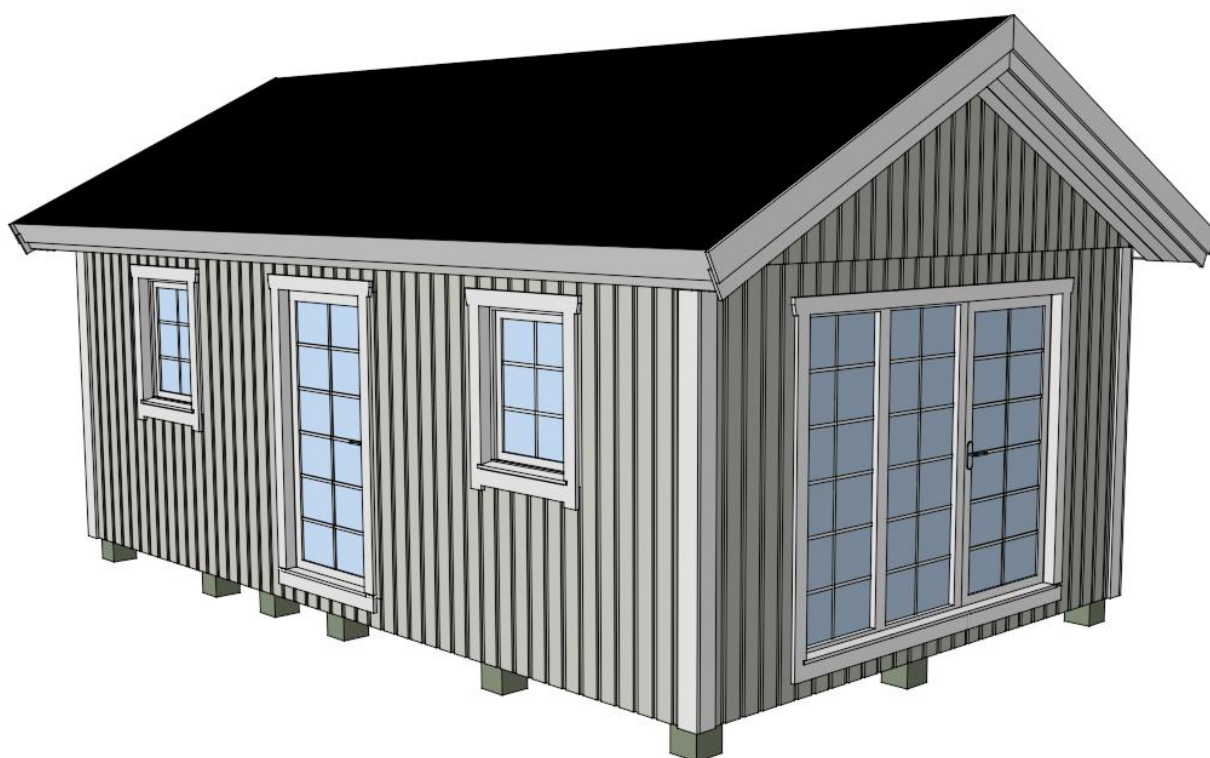

Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Akkan attefallshus 30m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund & bottenbjälklag

- Vattenpass för att väga in bärlinor.
- Grundstenar 18st, t.ex. lecablock eller gjutna plintar.
- Träskruv 5,0x80mm 100st för skarvning av bärlinor.
- Ankarskruv 5,0x40, ca. 770st för balkskor.

Golv

- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 560st, för 25mm & 30mm golvbrädor.
- Dyckert 1,7x40mm till golvlist

Stomme

- Träskruv 5,0x80mm ca.400st till väggblock och spikläkt.
- Träskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 150st till ytterpanel i hörn och under dörrar.

Loft


- Träskruv 5,0x100mm ca.40st till bärlinor / yttre ram.
- Ankarskruv 5,0x40, ca. 168st för balkskor.

Tak

- Skruv 5,0x100mm 24st för spikklossar.
- Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1400st till takbrädor.
- Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm, ca. 600st, Vindbrädor, takfot, underspikning
- Ankarskruv 5,0x40, ca. 880st för balkskor.

Fönster/dörr

- Montering Fönster/dörrkarm 5x100mm träskruv 66st
- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 160st
- Träkilar

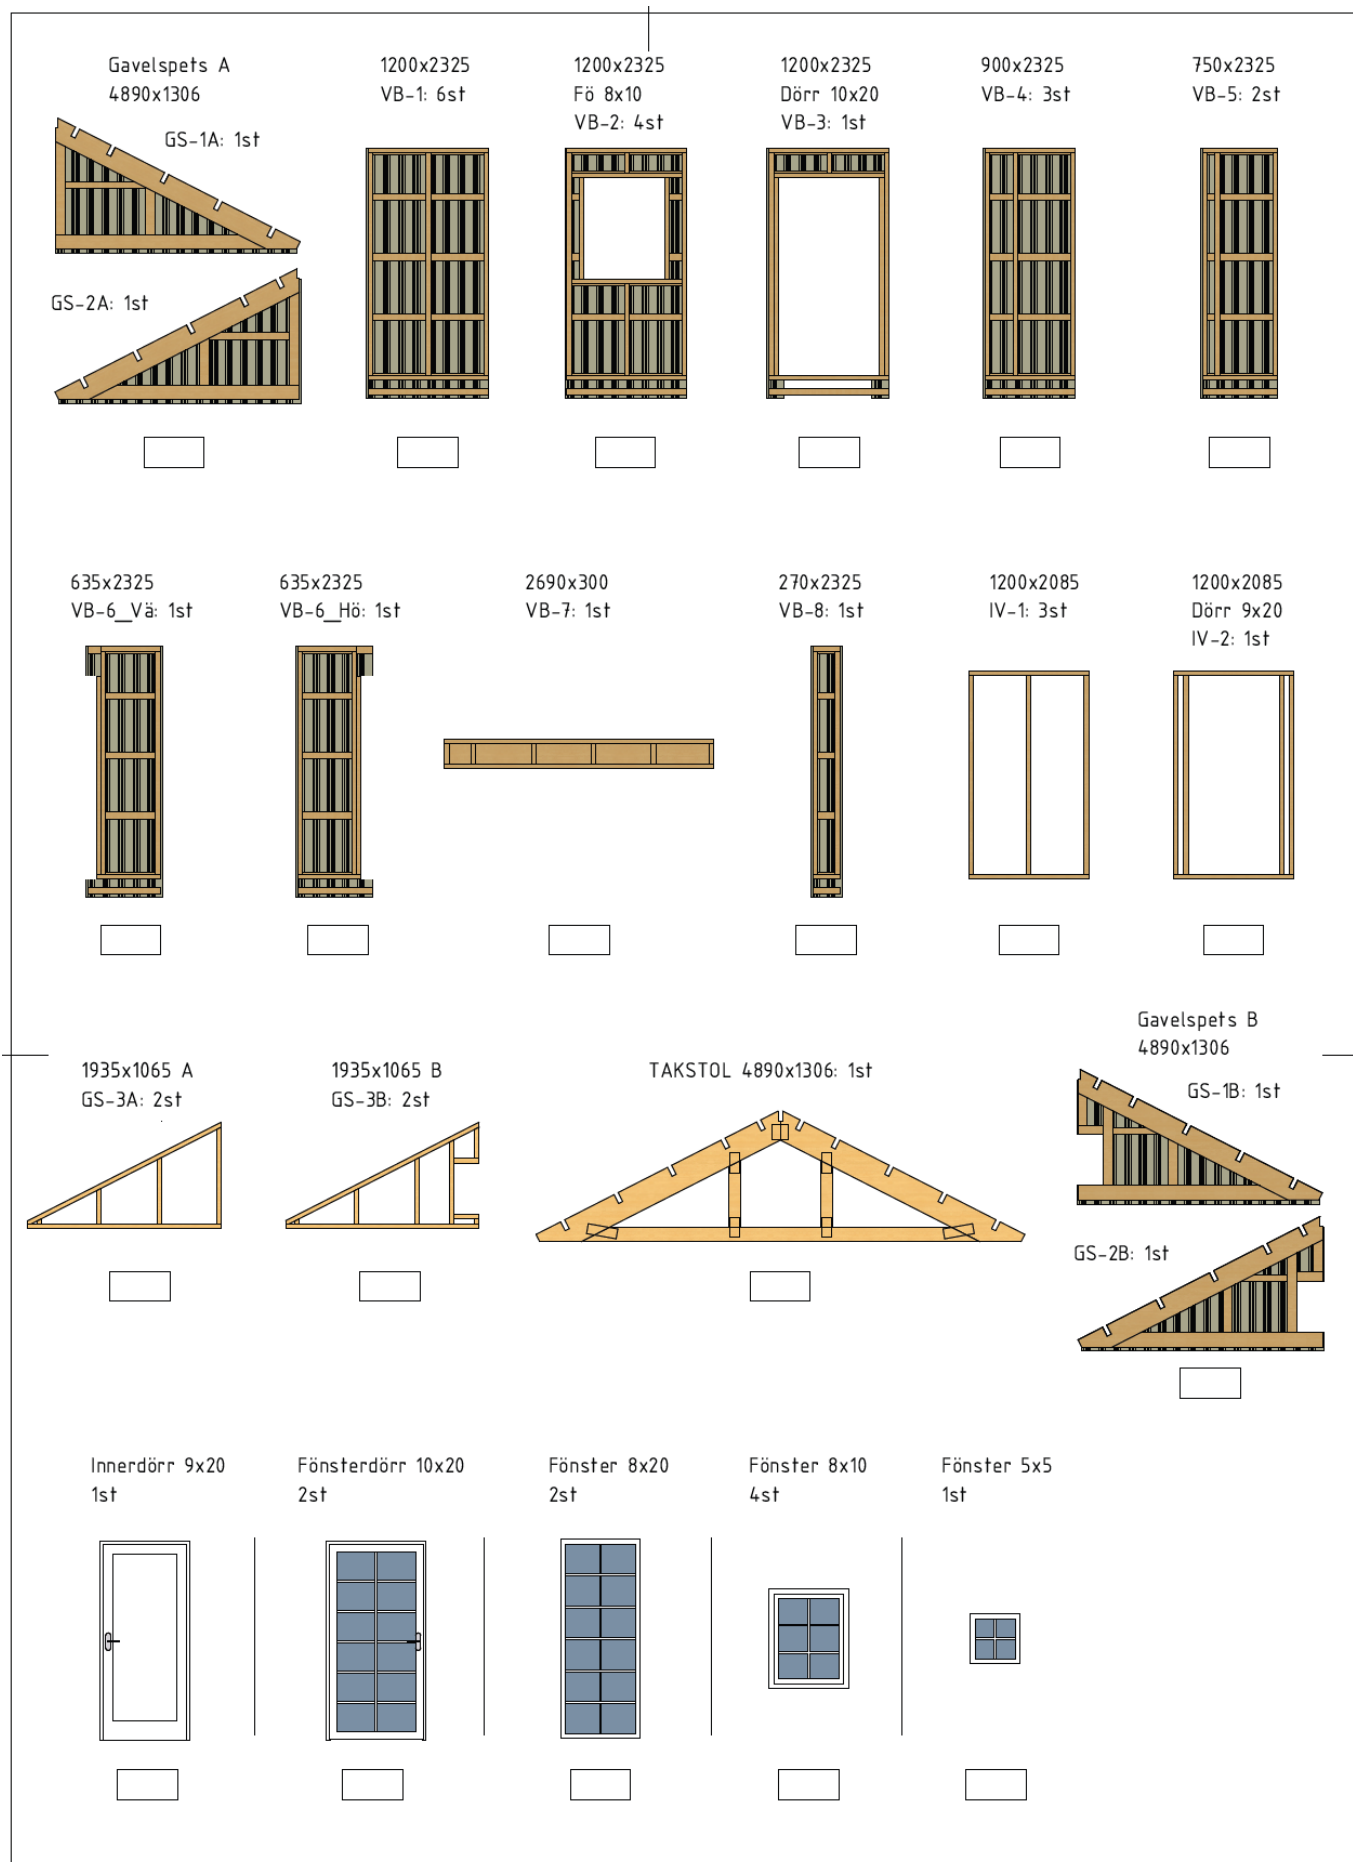

GOLVBJÄLKLAG 45x170		B1: L=4200: 6st B2: L=4070: 2st B3: L=2700: 6st B4: L=2065: 14st B5: L=1825: 14st B6: L=555: 4st	
GOLVBJÄLKLAG KORTLING 45x95			
TAKÅSAR 45x220		L=4784: 11st L=3024: 11st TASS: 12st	
LOFTBJÄLKLAG 45x120		L=3780: 6st L=2480: 2st	
VANGSTYCKE STEGE 45x120			
GOLV 25mm, ca. 26kvm GOLV LOFT 30mm, ca. 10kvm GOLVLISTER 16x70 ca. 31m TAK 20mm ca. 44kvm TÄTNINGLIST 8x2mm, 8m FOGLIST 8x21mm, 2m x4st		VÄGGREGEL 45x145 L=2235: 4st VÄGGREGEL 45x95, ca. 7m VÄGGREGEL 45x70 L=1995: 3st SPIKLÄKT 34x70 L= ca. 11m Z-Panel 22x170 L= 2505: 4st Z-Panel 22x170, ca. 5m RÅPLAN 22x120, ca. 110m RÅPLAN 22x145, ca. 10m RÅPLAN 22x170, ca. 55m BALKSKO 45x168: 44st BALKSKO 45x137: 48st BALKSKO 45x96: 12st Hållplatta 40x160x2,0 15st Vinkelbeslag 90x90 16st Vinkelbeslag 70x70 8st	


Montering

Grund


Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Lägg ut bärlinor enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

Om bjälklaget ska isoleras kan det vara bra att förbereda yttersta facket i gavlarna innan väggblocken monteras.

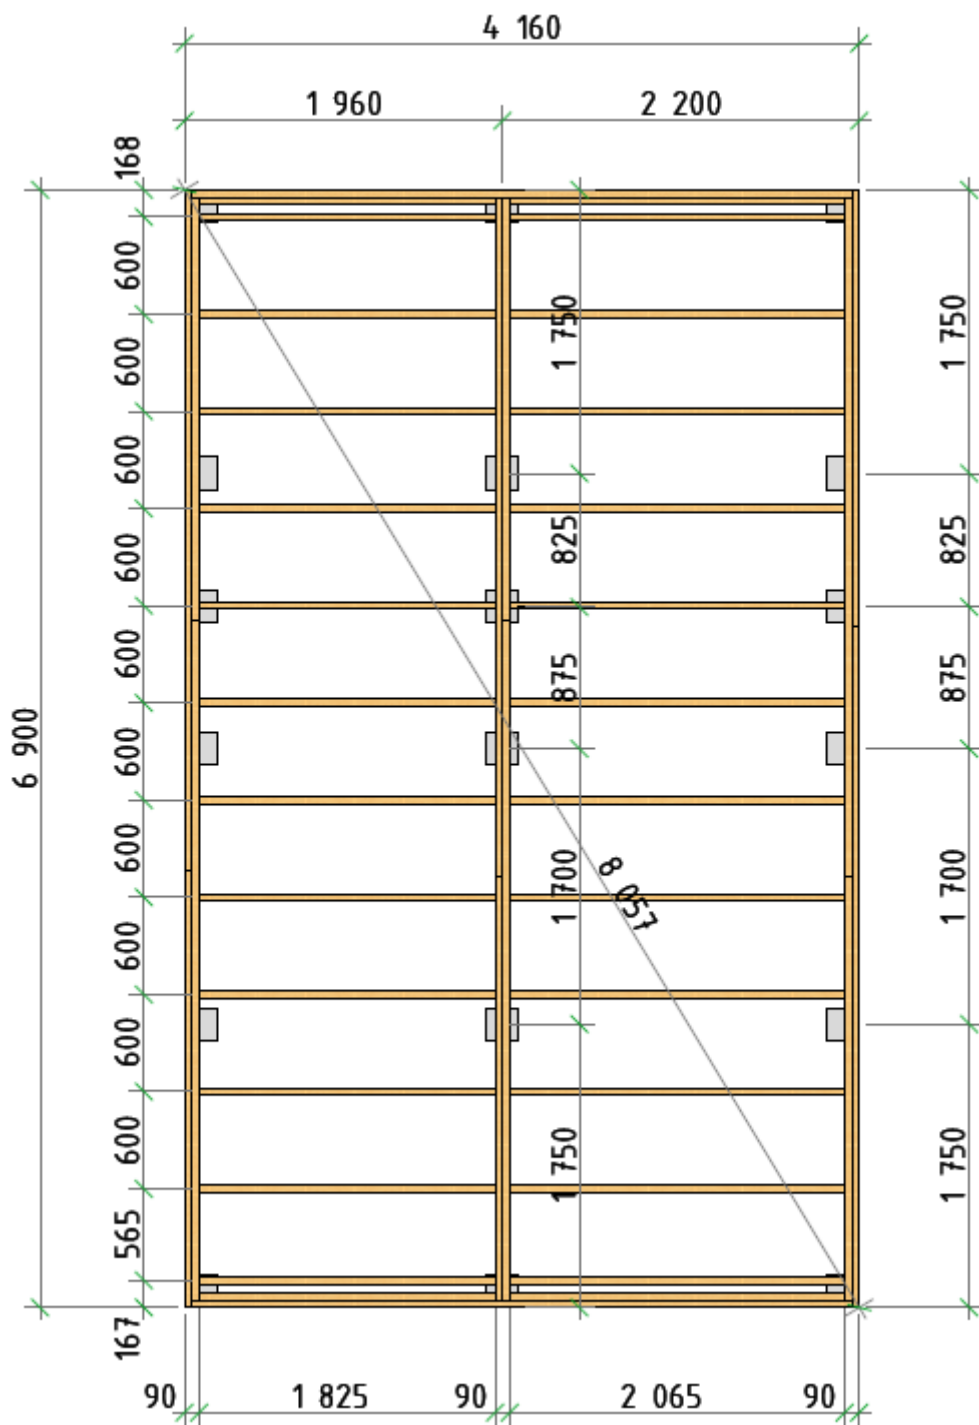


Notera att B3 i vissa positioner kan behöva kortas ner från 2700mm till 2610mm

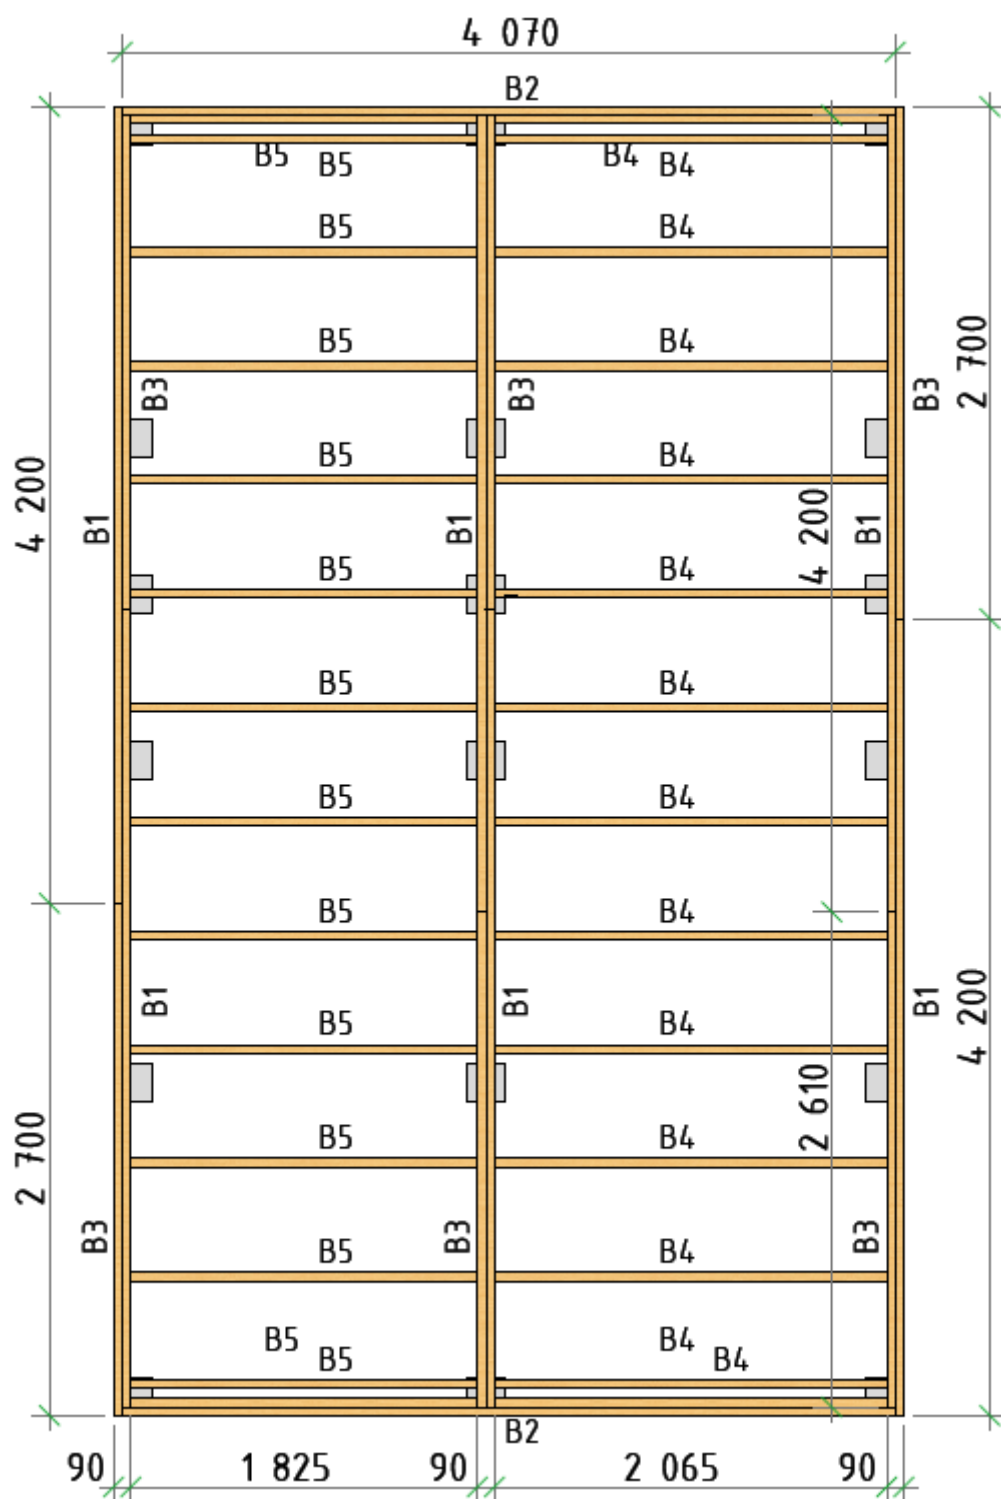


Bärlinan består av dubbla 45x170 ställda på högkant. De måste skarvas.

Lägg skarvarna omlott som på bilden och skruva ihop bärlinorna.

Använd träskruv 5,0x80, 2st á c/c600mm

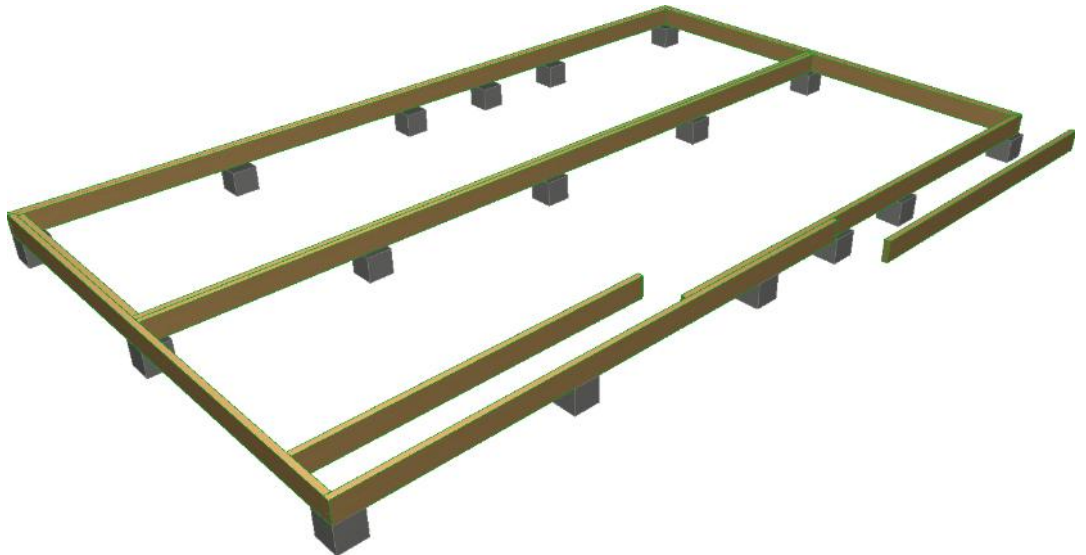


Alla regler i bärlinan ska ligga i samma höjd i ovankant. Hörn skruvas ihop enligt figur, regler kan behöva kapas något för att få rätt längd.


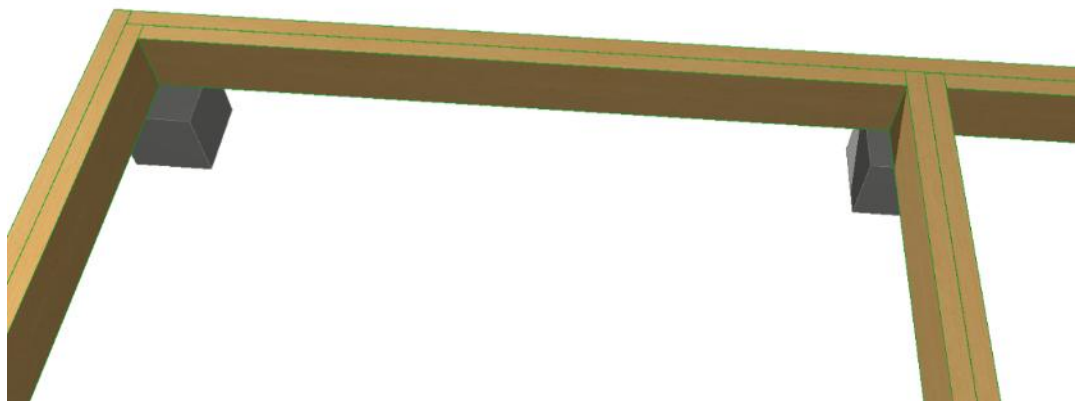


Golvbjälkar skruvas i bärlinor med hjälp av balkskor 45x137.

5+5 ankarskruv 5,0x40 i bärlinan, 3+3 i golvbjälken.

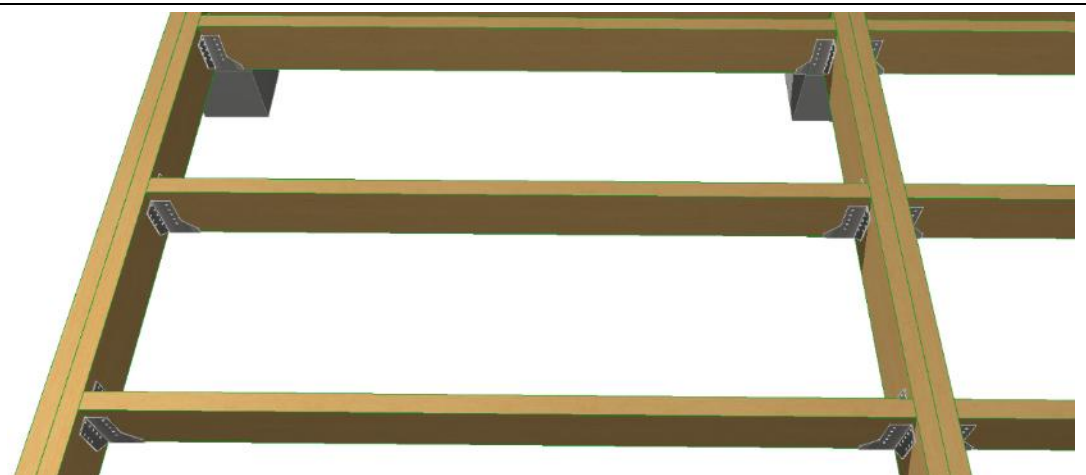


5+5 ankarskruv
5,0x40 i
bärinnan, 3+3 i
golvbjälken.

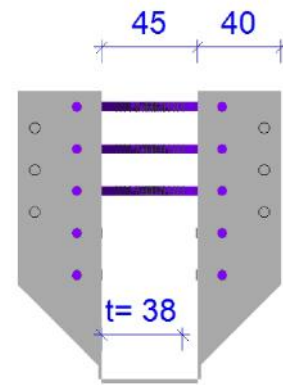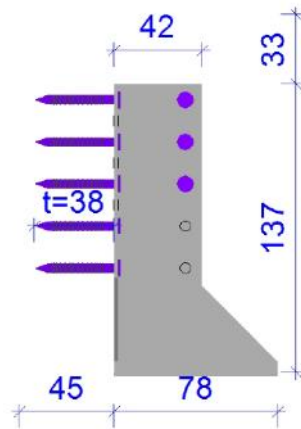


Stomme

Bilden visar
principskiss på
ett väggblock
sett från sidan.


Den nedersta
spikläkten i
väggblocken
kan styras emot
golvsbjälklaget
men behöver
inte skruvas
fast.

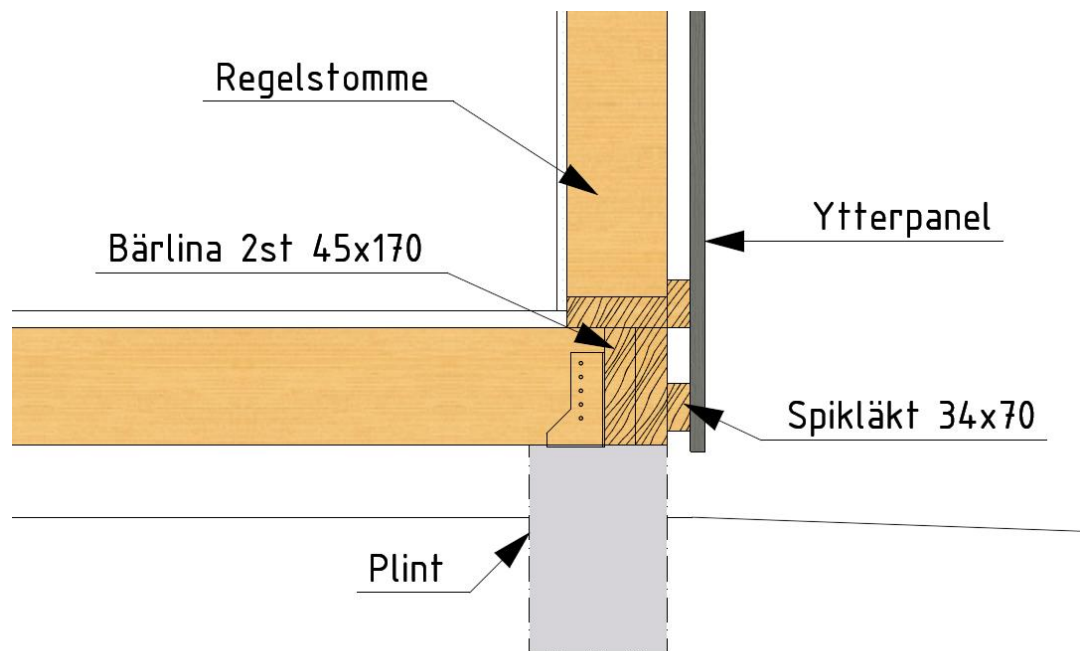

Vy över hur
blocken
placeras.

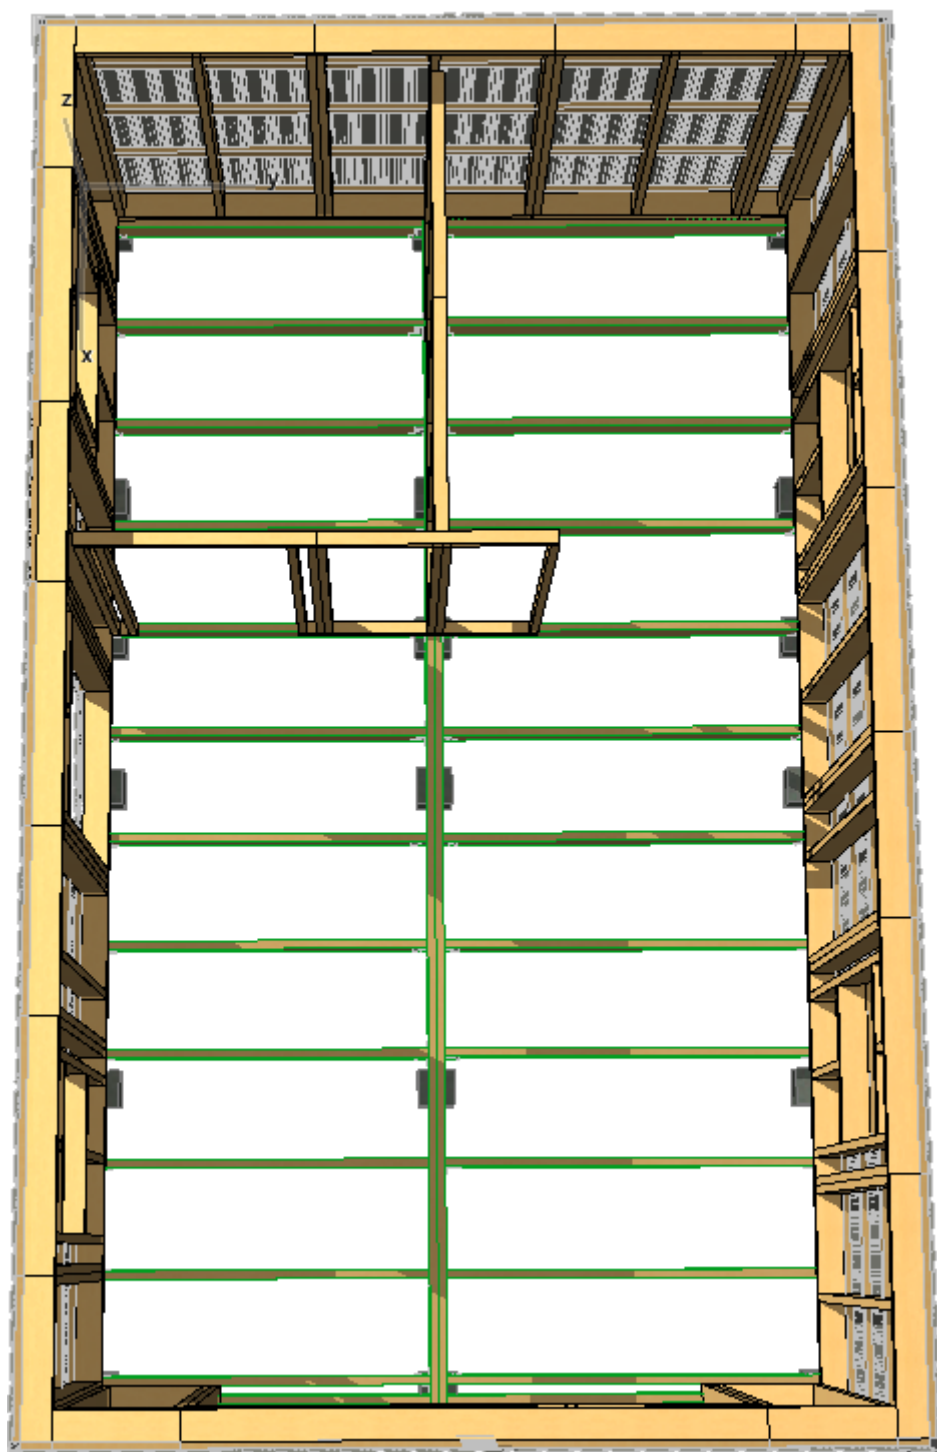


Planritning över
hur
ytterväggblock
och
innerväggblock
placeras.

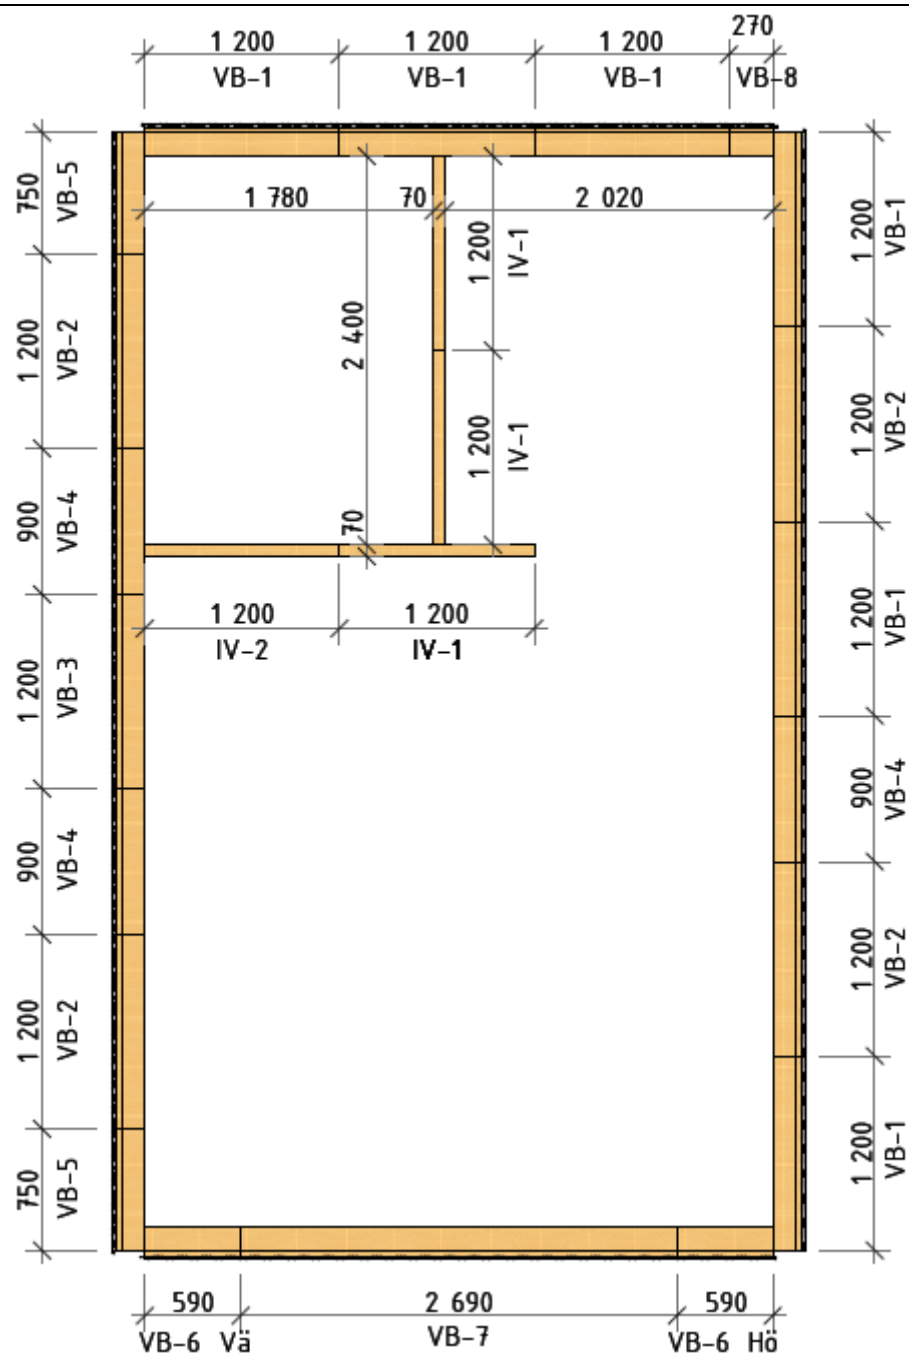

Montera alltid
blocken från
höger till
vänster.



Skruva blocken i
syllen med 4st
träskruv
5,0x80mm

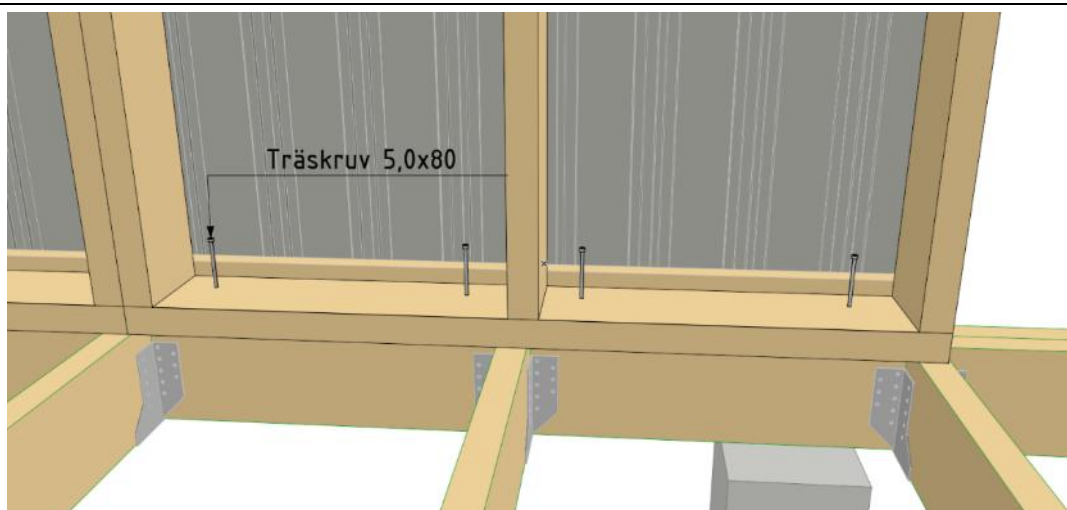


Skruva ihop
hörnen med
träskruv
5,0x80mm
enligt bild.




Se till att
vindpappen
kläms mellan
blocken när de
styrs ihop och
skruva med 8st
träskruv
5,0x80mm.


Ca 10cm från
nedre och övre
kant och sedan
fördela jämnt.

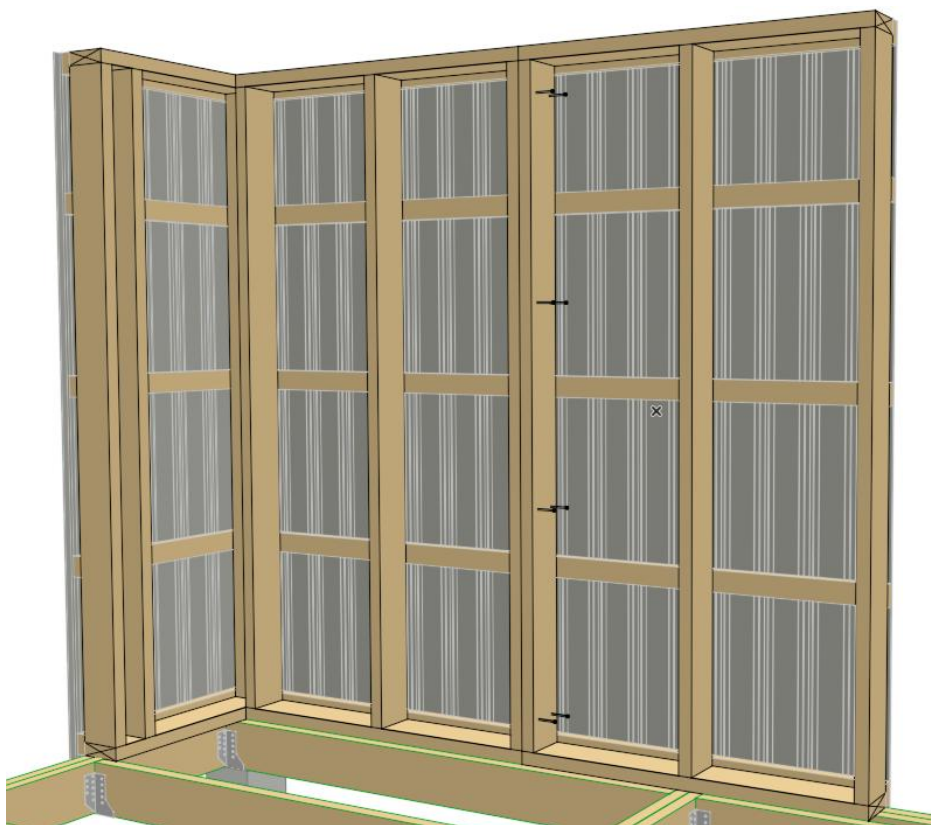


På utsidan i varje hörn kapas medföljande spikläkt till och skruvas med 2st 5x80mm skruv i varje.

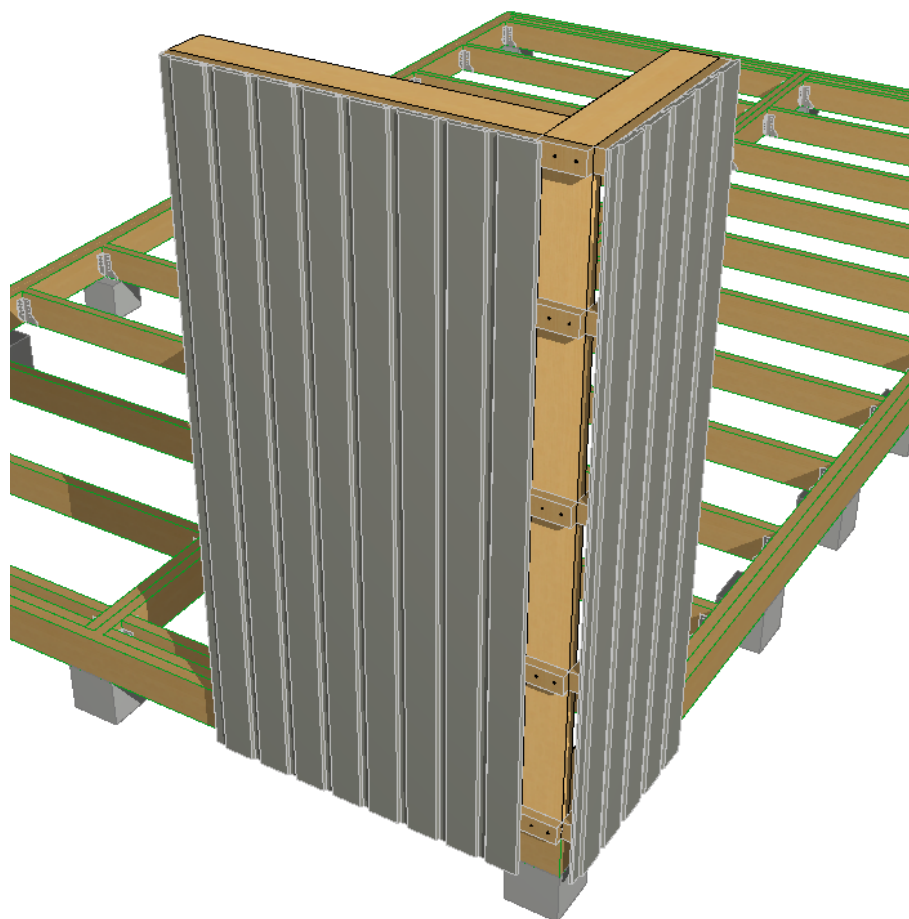


Sedan monteras medföljande ytterpanel-brädor i hörnen, med rekommenderad skruv.

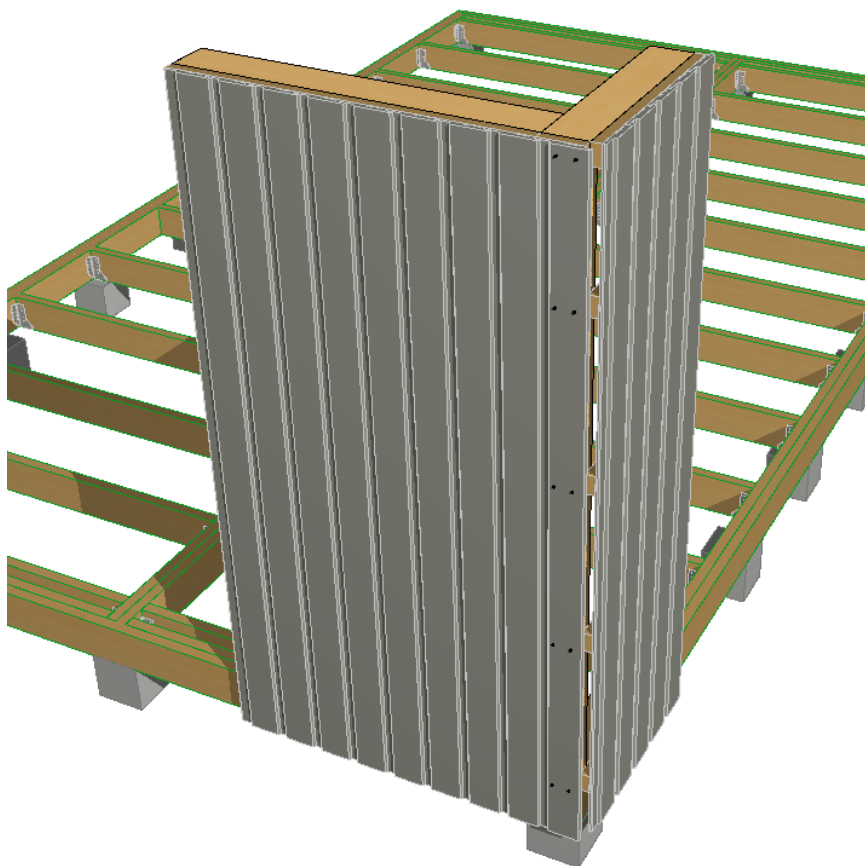

Väggblock ovan öppning i gavelvägg skruvas med 4st träskruv 5,0x80 i vardera sida.

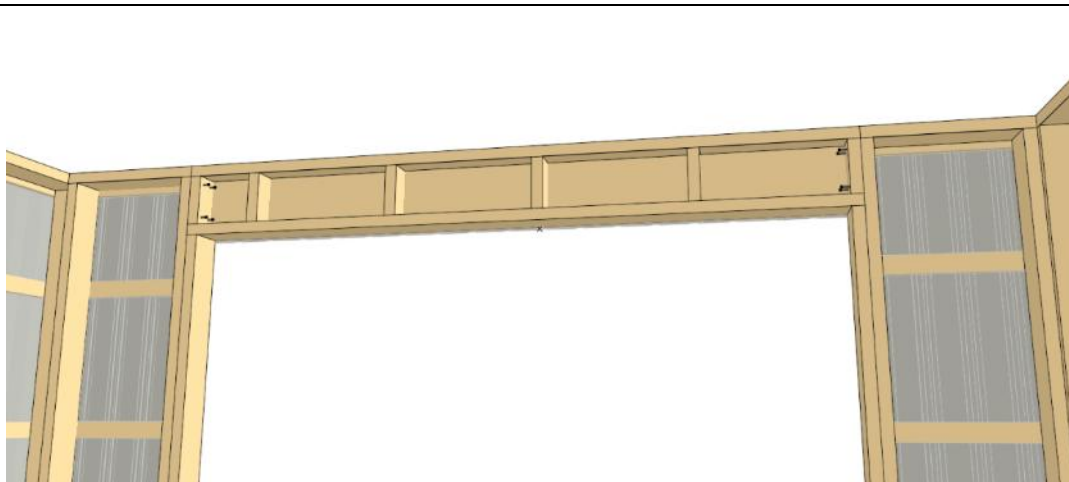

Spikläkt och ytterpanel kapas till och monteras under öppning i gavelvägg samt under ytterdörr.

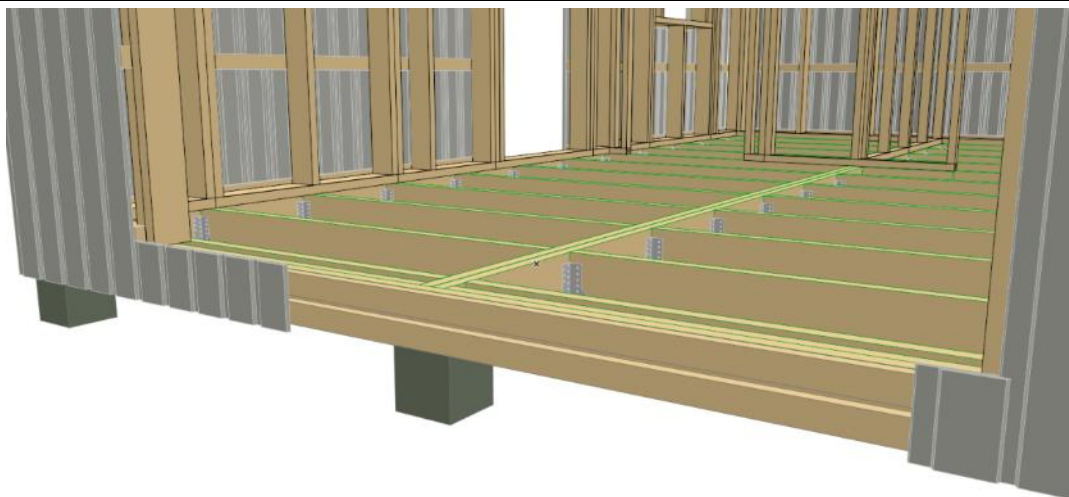


I väggblock förberett för ytterdörr ska syllregeln kapas i öppningen, efter montering av väggblocket.




Väggblocken ska kompletteras med extra regler enligt figur. Förstärkningen är direkt under upplag för mitt-takstolen.

Fäst innerväggsblocken i ytterväggsblock och golvbjälkar med träskruv 5,0x80mm ca c/c300 samt skruva ihop innerväggsblock med 4 st träskruv 5,0x80mm

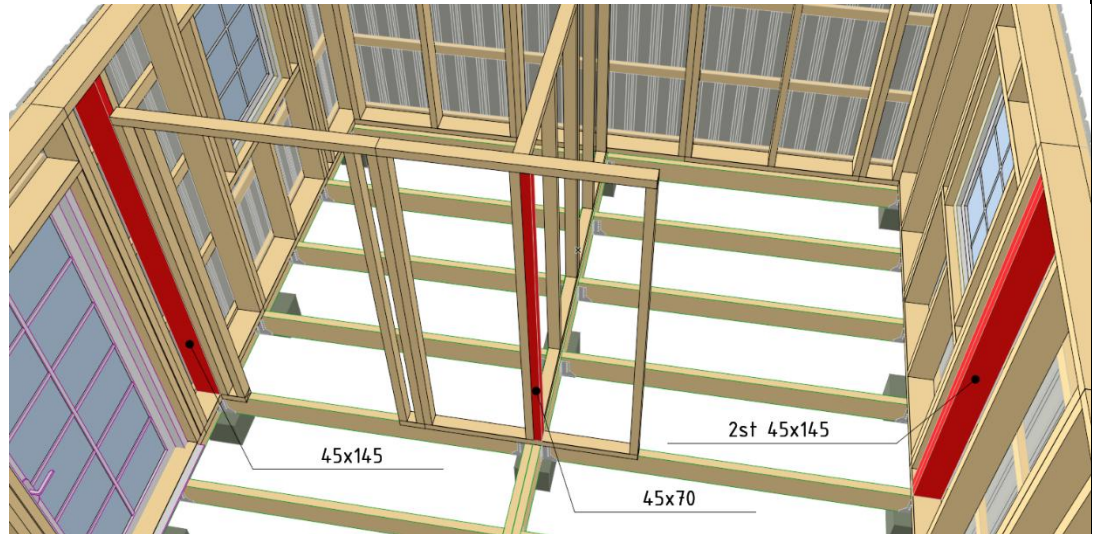


Kompletterande regler skruvas i varandra/till befintlig regel med 8st träskruv 5,0x80mm.

Ovankant fästs ovanifrån med 2st träskruv 5,0x80 /regel. Underkant fästs till syll med 1st 70mm vinkelbeslag, 4+4 ankarskruv 5,0x40.

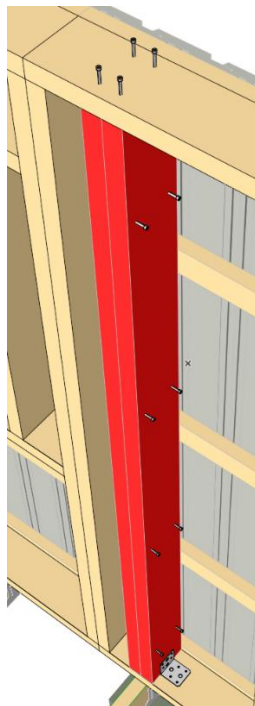

Planritning visar placering av extra väggreglar som monteras.

Skrivas ihop med syll och hammarband samt intilliggande reglar.

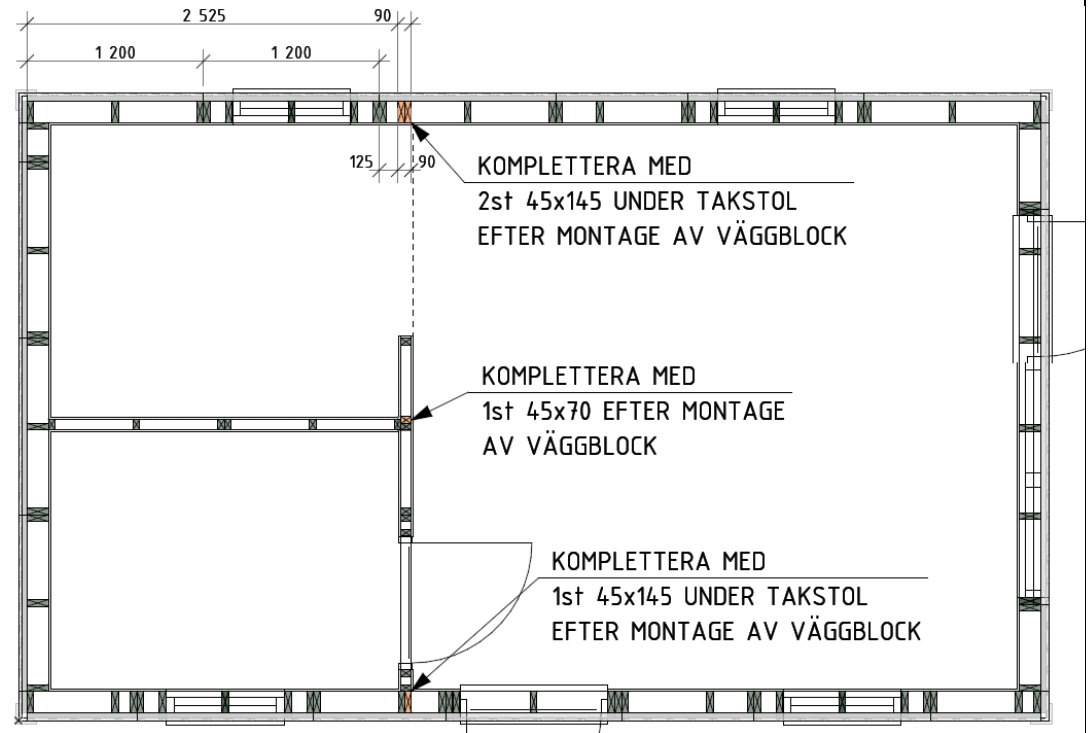

Montera ihop gavelspetsar med medföljande hållplattor 40x160 och ankarskruv. Montera den övre plattan ca 300mm undernocken. 4+4 ankarskruv 5,0x40 per hållplatta.

Gavelspets B med fönster skall monteras i anslutning till loftet. Gavelspets A skall monteras ovanför sammansatta fönster- & dörrpartier.


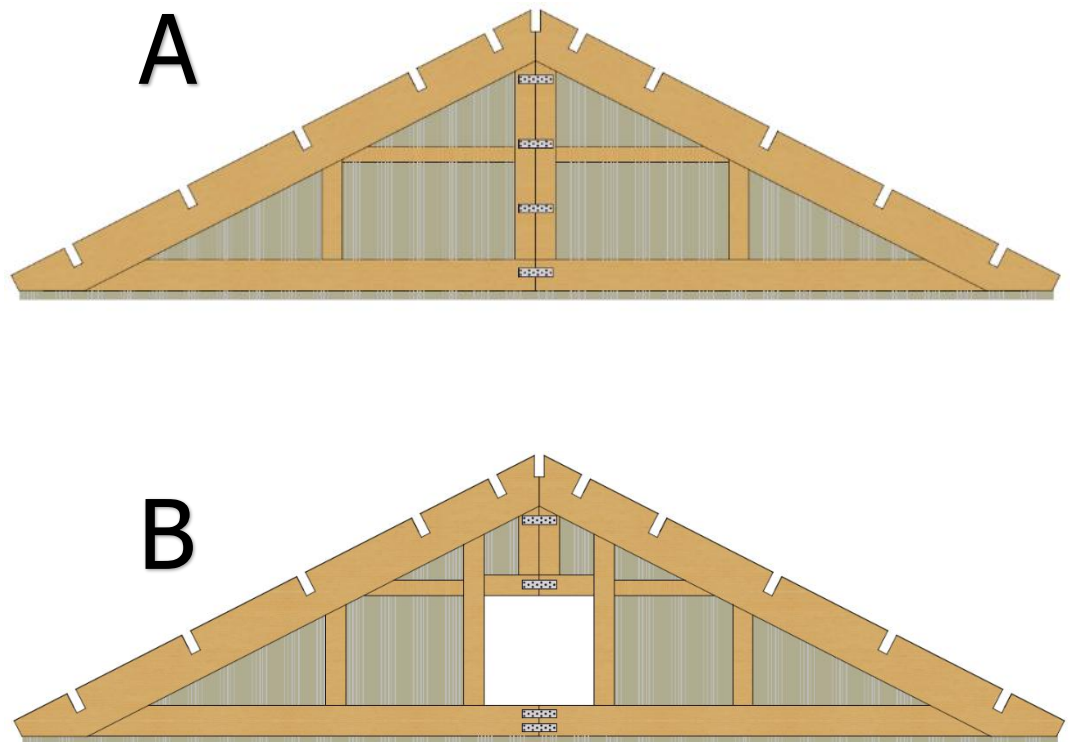


Bild från sidan på gavelspets. Ytterpanelen på gavelspetsen styrs mot ytterpanelen på gavelväggen.

Fäst varje gavelspets med medföljande vinkelbeslag 90mm.

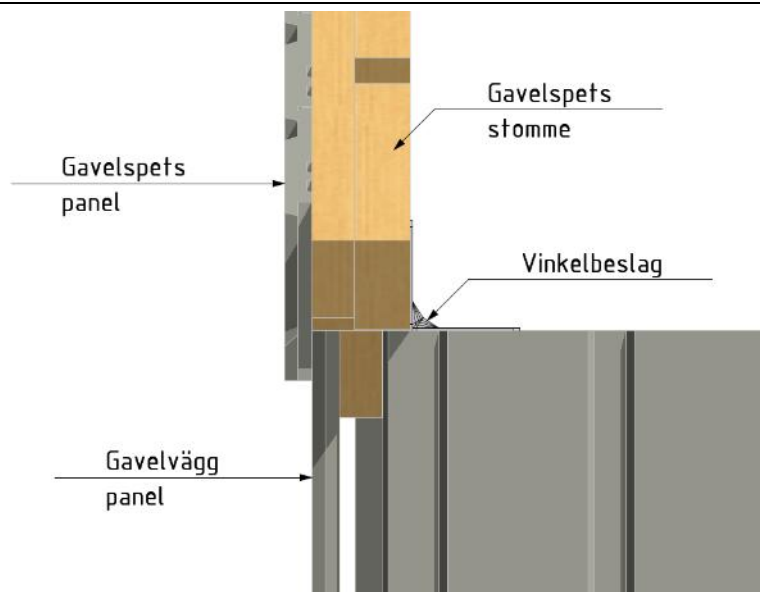

Montera vinkelbeslag 90mm vid montering av gavelspets. 1st på varje sida.


5+5 ankarskruv 5,0x40 per vinkelbeslag.



Montera inre gavelblock enligt figur.

2st 90mm-vinkelbeslag per block enligt figur. 5+5 ankarskruv 5,0x40 per vinkelbeslag.

Gavelblocken skruvas även ihop med varandra samt i nedre väggblock enligt figur. Använd träskruv 5,0x80 2st á c/c300mm

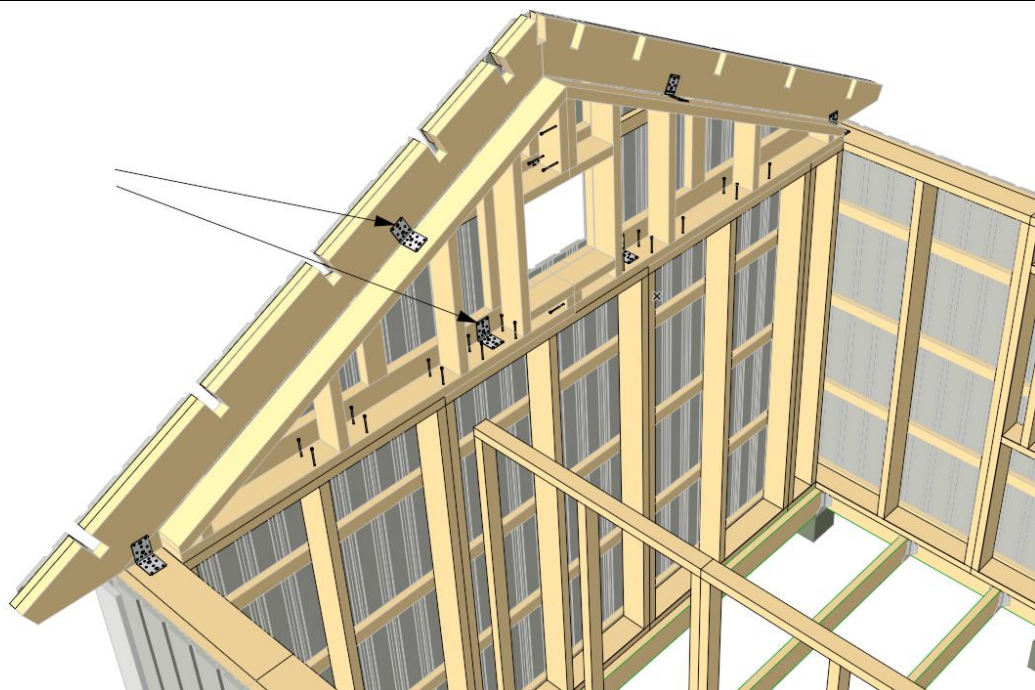


Mitten-takstolen placeras enligt måttsättning.

Mått från utsida väggstomme/ bottenbjälklag.




Montera mitten-takstolen med 1+1 90mm vinkelbeslag per sida.

5+5 ankarskruv 5,0x40 per vinkelbeslag.

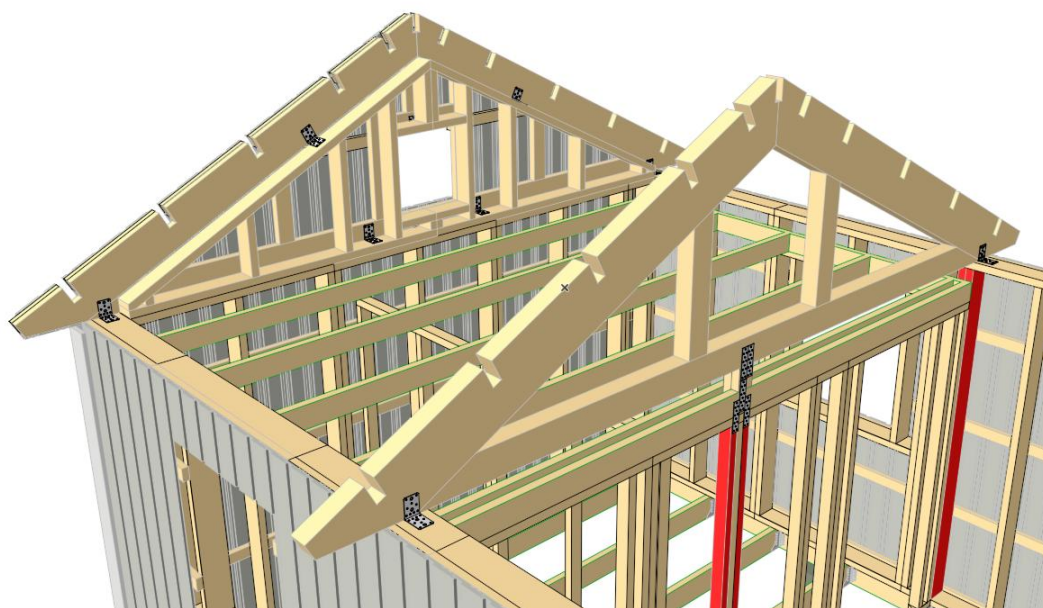


Takstolen behöver upplag på mitten. För detta monteras 2st klossar. Kapas till av medföljande 45x95-vrike.

Skruvas ihop med varandra samt yttersta golvbjälke om stugan har loftbjälklag. 4+4 5,0x80.

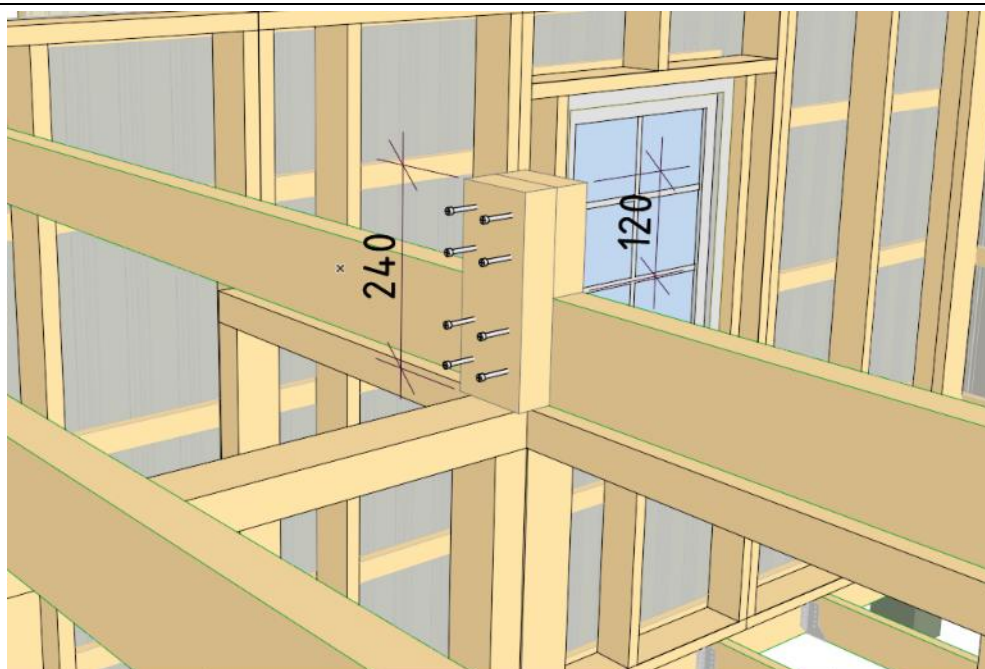


Skrivas ihop med resterande loftbjälklag enligt figur

Takstolen fästs med 2st hålplåtar 40x160 per sida.
4+4 ankarskruv 5,0x40 per hålplåt.

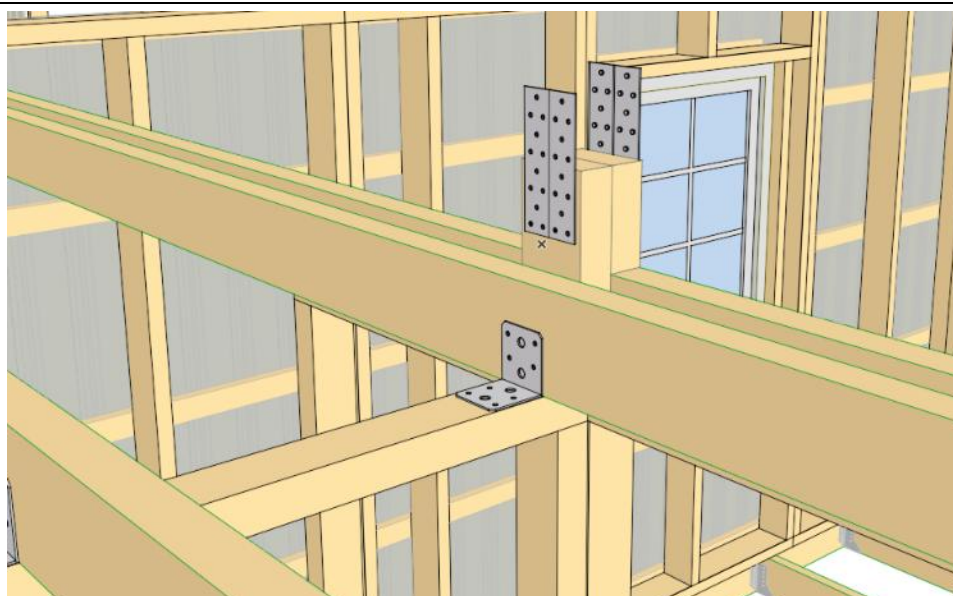


Vy från andra sidan.
Takstolen fästs med 2st hålplattor 40x160 per sida.

Montera också 2 hålplåtar 40x160 så att 95-regel fästs ihop med golvbjälke som fästs ihop med väggreglar enligt figur.

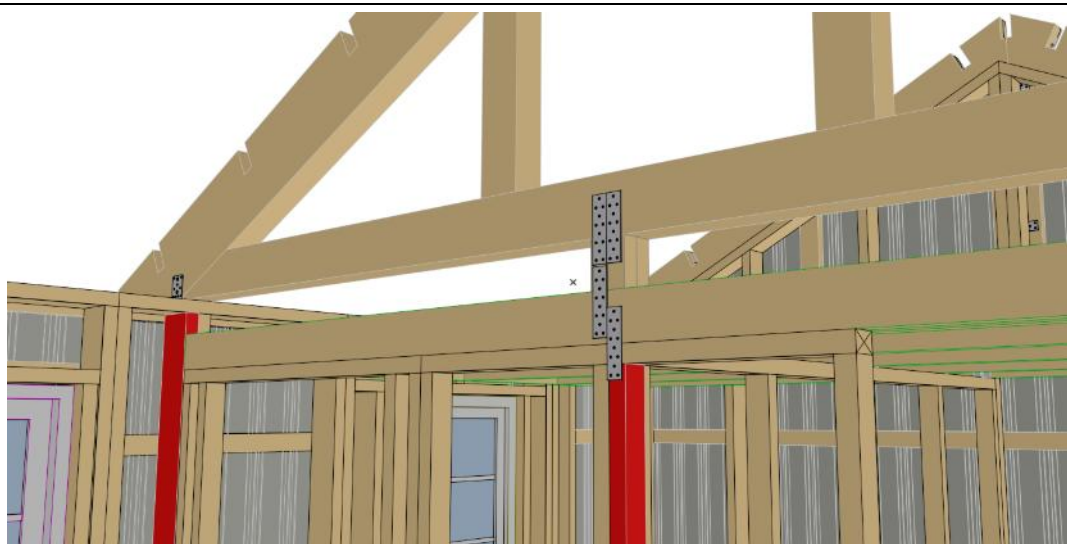

Loft


Loftbjälklaget består av 45x120-reglar. Den yttre ramen skruvas fast i väggreglarna med träskruv 5,0x100, 2st á c/c600mm

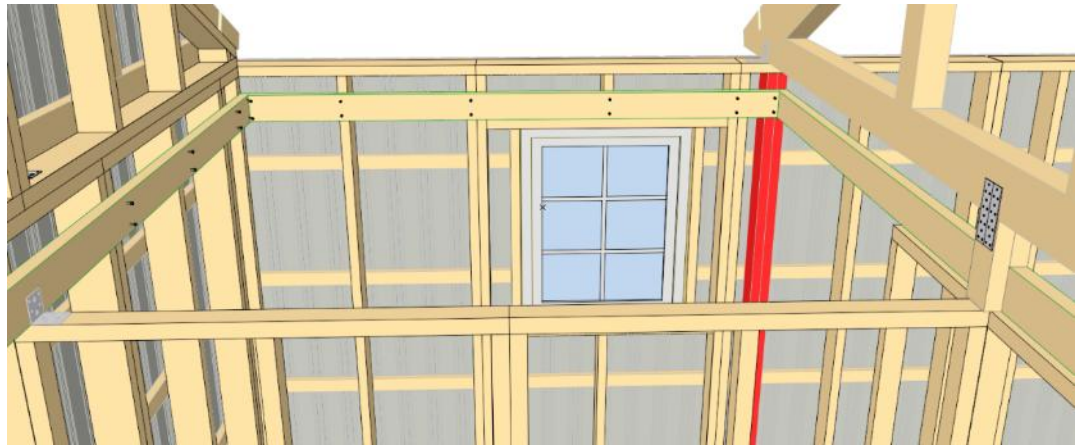

Golvbjälkarna monteras c/c600mm. Placering ska vara direkt ovan väggreglarna i innerväggen.


Golvbjälkarna fästs med balksko 45x96 i regeln mot yttervägg. 4+4 ankarskruv i bärlina, 3+3 i golvbjälke.

1 Vinkelbeslag 70mm mot innerväggen per golvbjälke, 4+4 ankarskruv 5,0x40


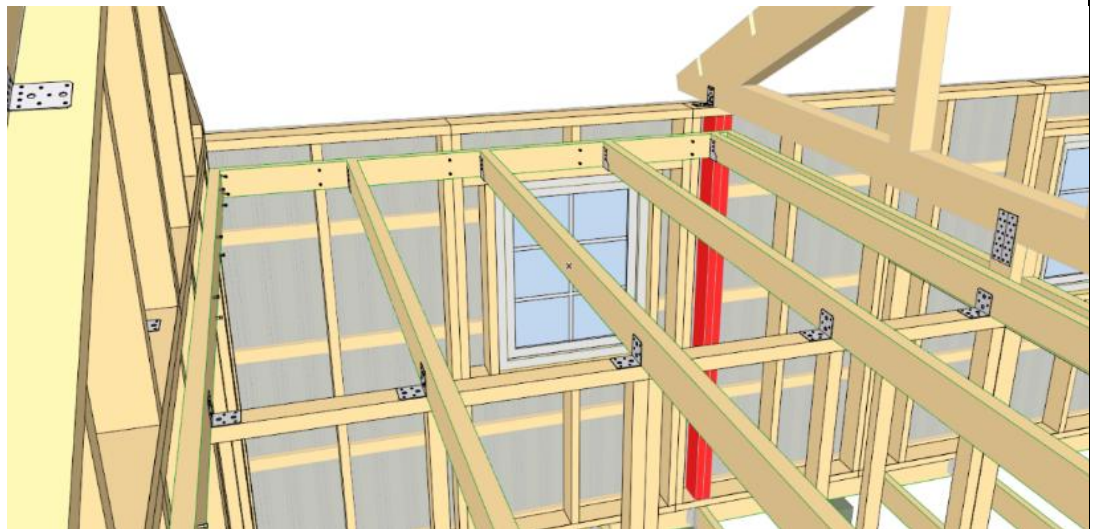


Tak

Använd balkskor 45x168 för fixering av takåsar i takstolen och gavelspetsarna.

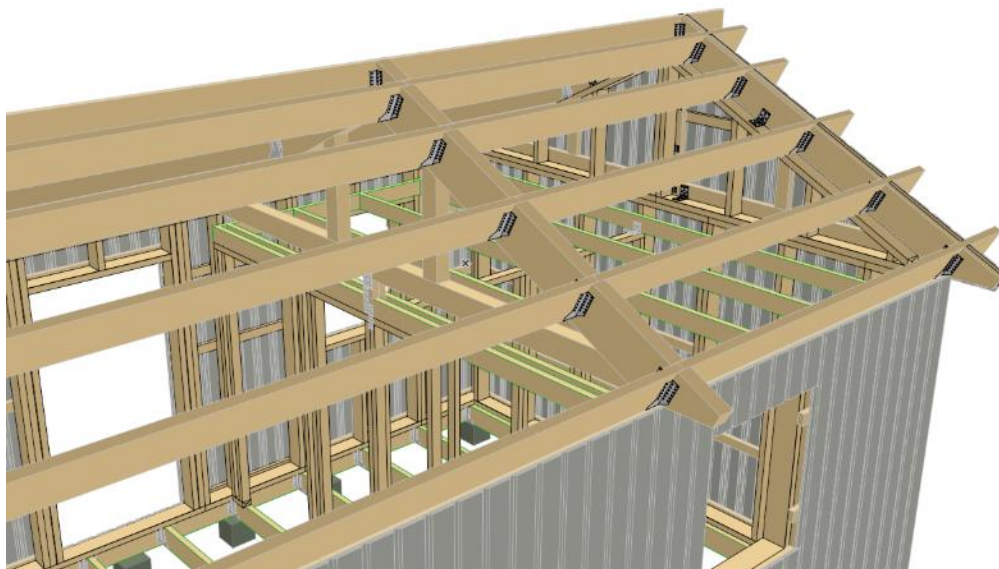


Montera ankarskruv 5,0x40 enligt markeringarna. 6+6 i takstol, 4+4 i takås.



Montera spikklossar för att underlätta montering av underspikning och takfot.

Styr upp klossen så ovankant livar med takåsarna och skruva inifrån genom takåsen. 2st 5,0x100 per spikkloss.

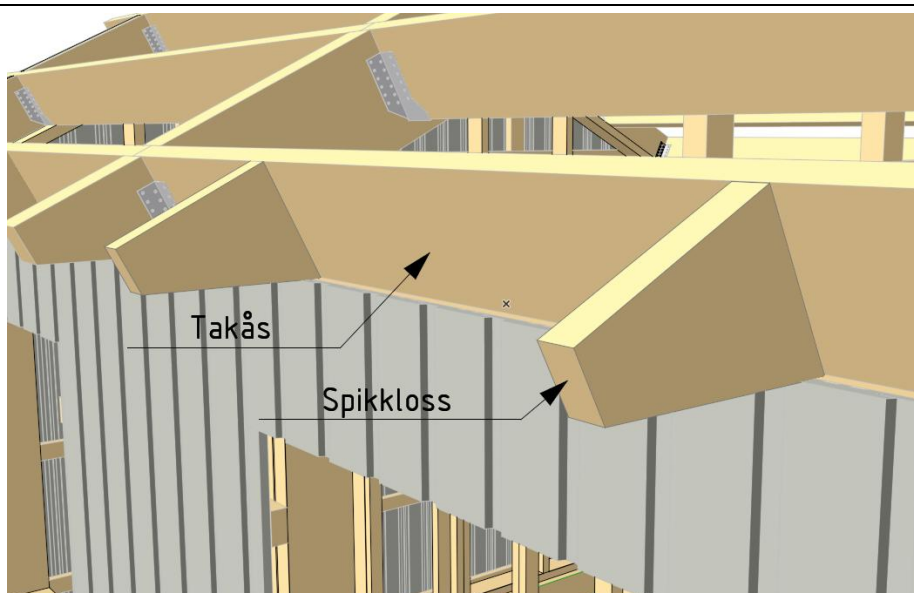


Montera klossarna med ca 1m c/c. 6st på varje långsida.




Montera taket.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

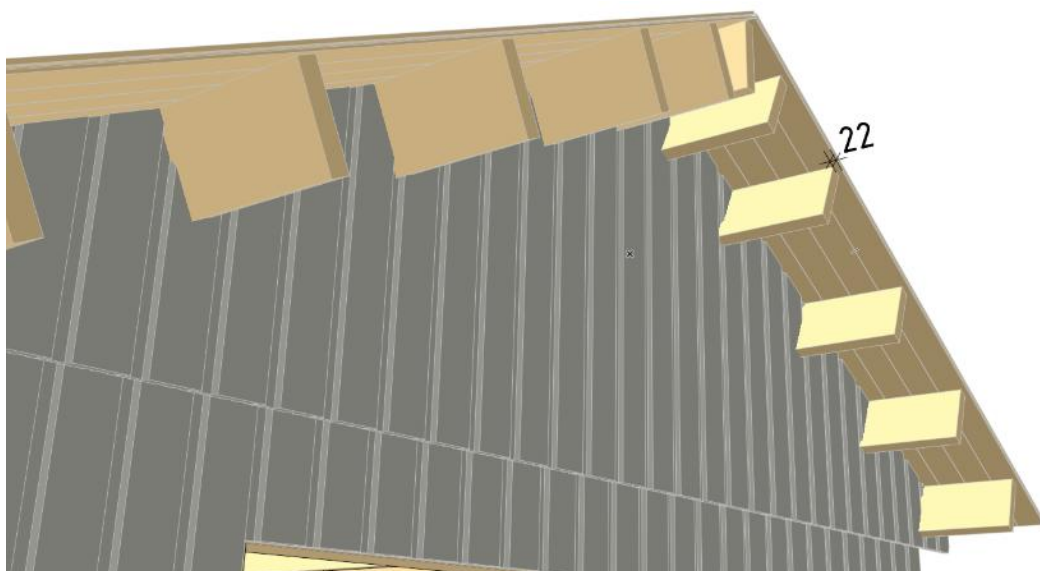

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

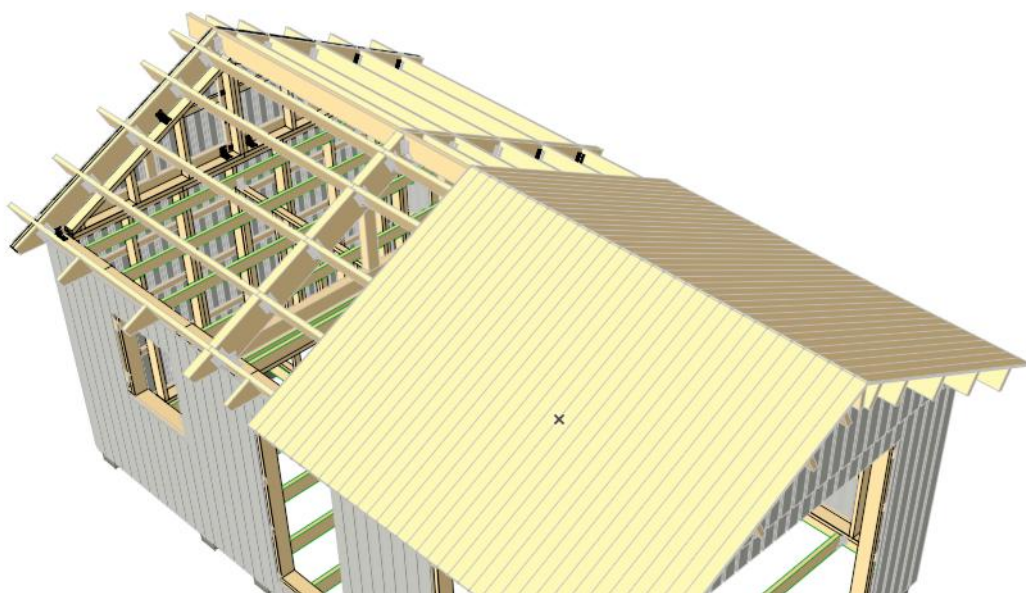

Taket kapas 22mm utanför änden på takstolar och gavelspets.



Kapa till och montera nedre vindbrädorna. Vinkeln inocken är 27°.

Tänk på att dra ner dem minst 22mm under takåsarna för att täcka underspikningen




Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.




Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan jäms med i underkant mot undre vindbrädan.

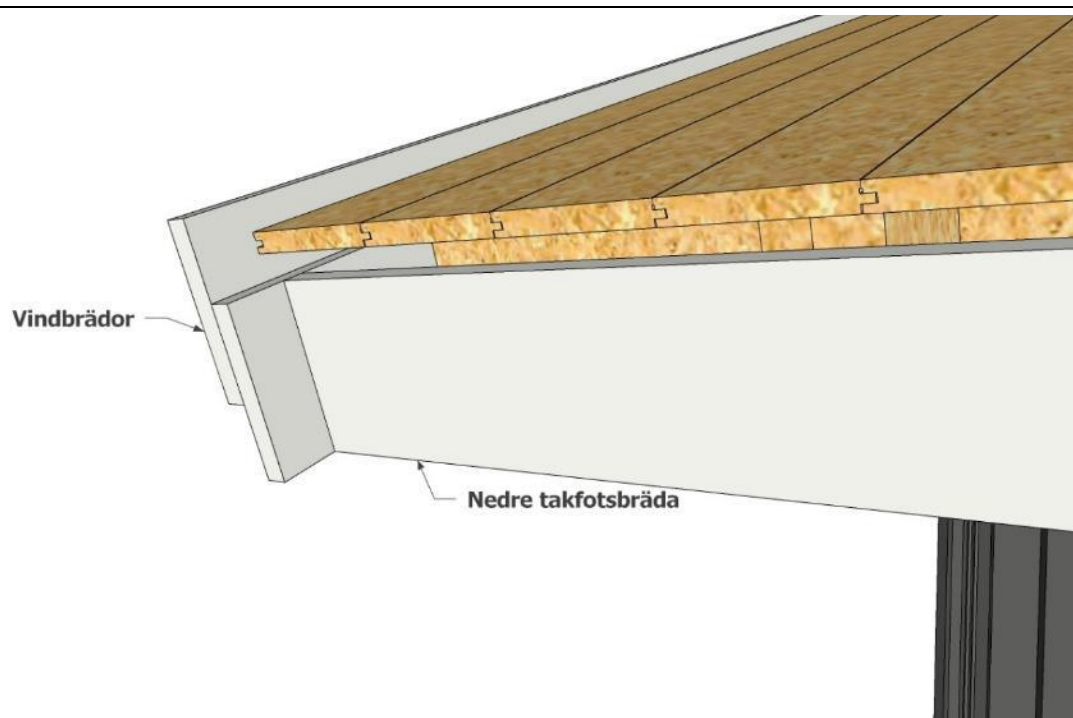


Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

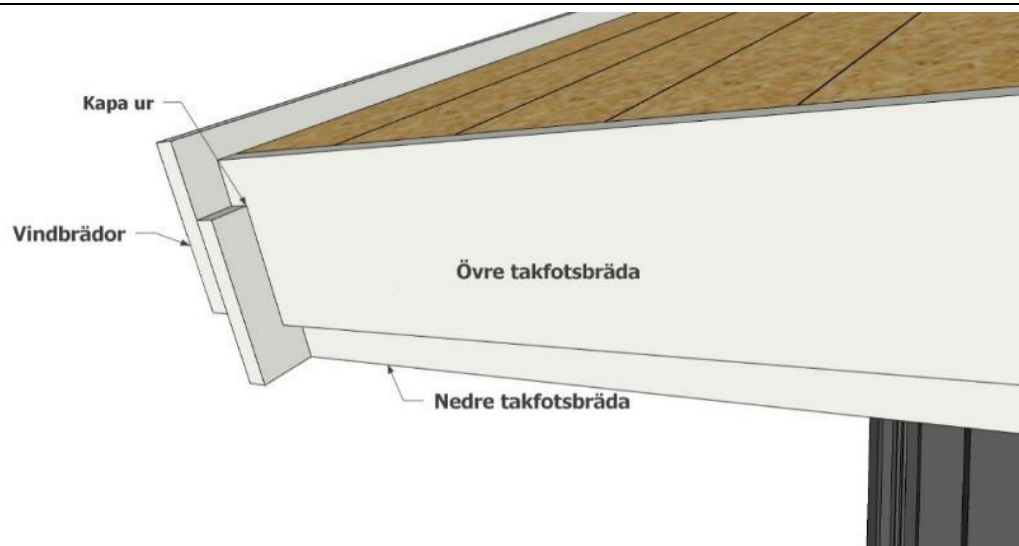

Kapa till och montera underspikning.

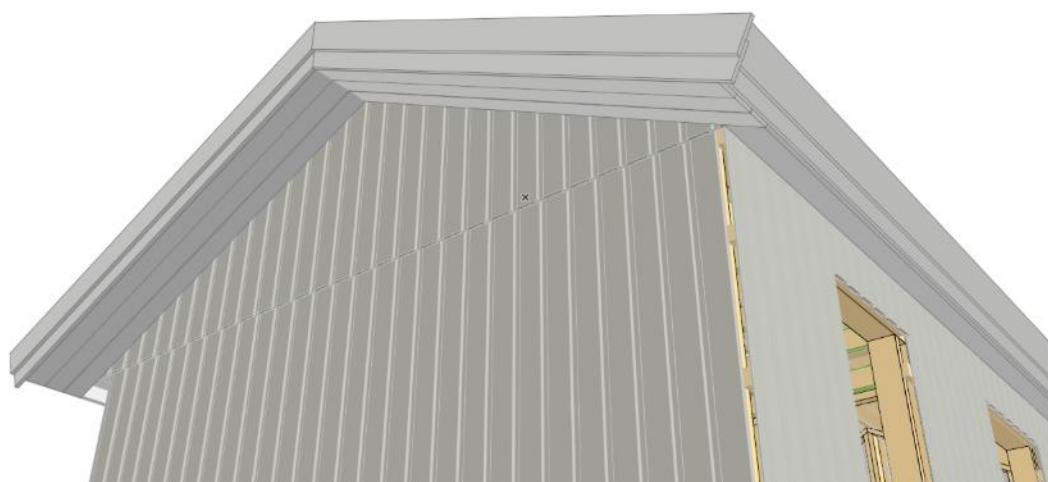

**Fönster,
dörr**

Skär bort
vindduken i
öppningarna,
och
montera
fönster och
dörr med
kilar och
skruv.




Fönster och
dörr
monteras
jäms med
utsida
regelstomme.




Sammansatta fönsterpartier

Montera ihop dörr- och glaspartierna med 2 st tätlistor mellan varje enlig bild.

Montera med 8 st 4,5x70mm skruv i varje skarv. Skruva växelvis in- och utsida.

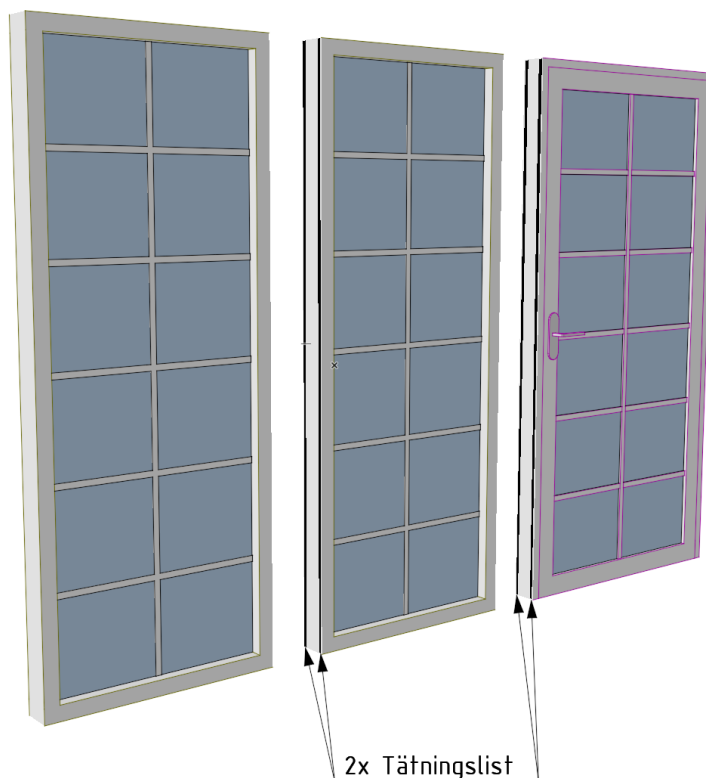


Montera sedan foglist på in- och utsida, 15mm kortare uppe och nere på utsidan för att foder ska passa in.

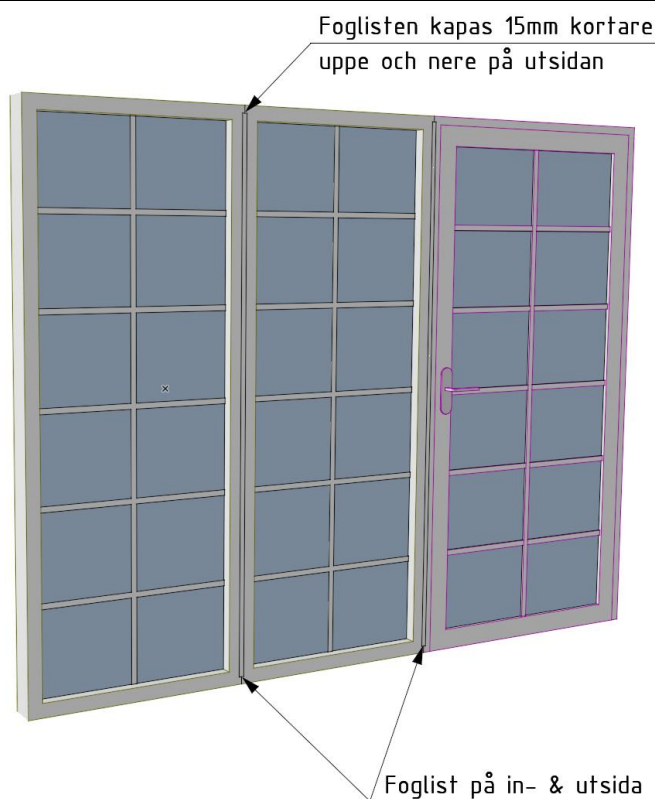


Kapa och klyv till utv. salning fönster ur medföljande 22x120. Kapmått 2 st 22x56 L= 756 och 2 st 22x56 L=1000 till utsida monteras enl. bild.

Inv salning anpassas efter eget tycke.

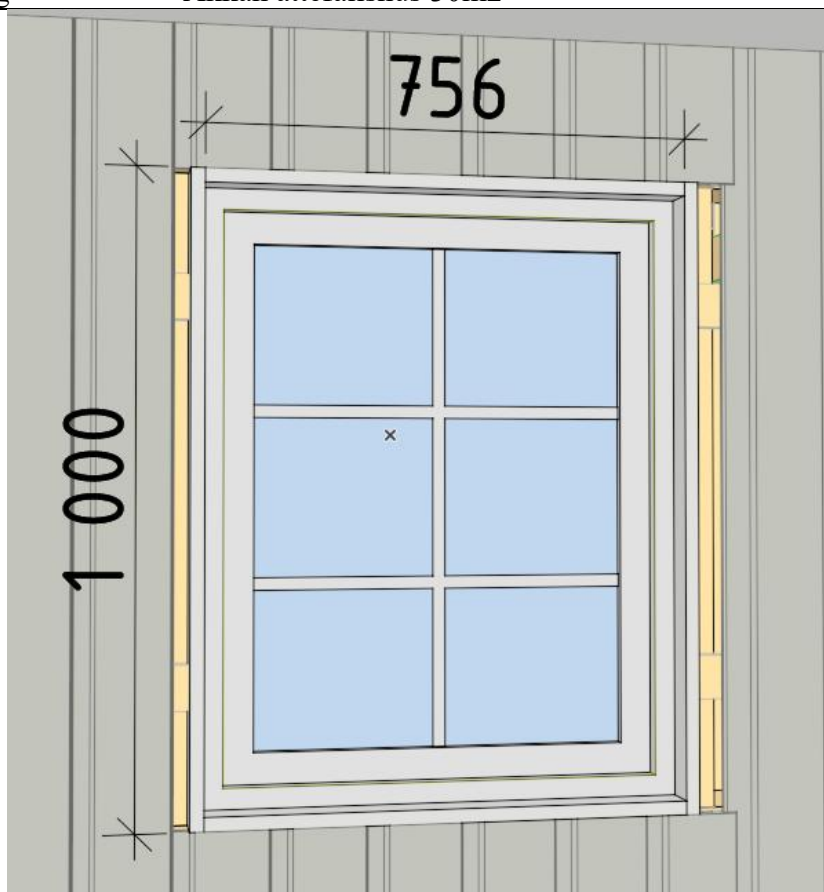


Kapa och klyv till utv. salning dörr ur medföljande 22x120. Kapmått 2 st 22x56 L= 956 och 2 st 22x56 L=2000. Monteras enl. bild.

Inv salning anpassas efter eget tycke.

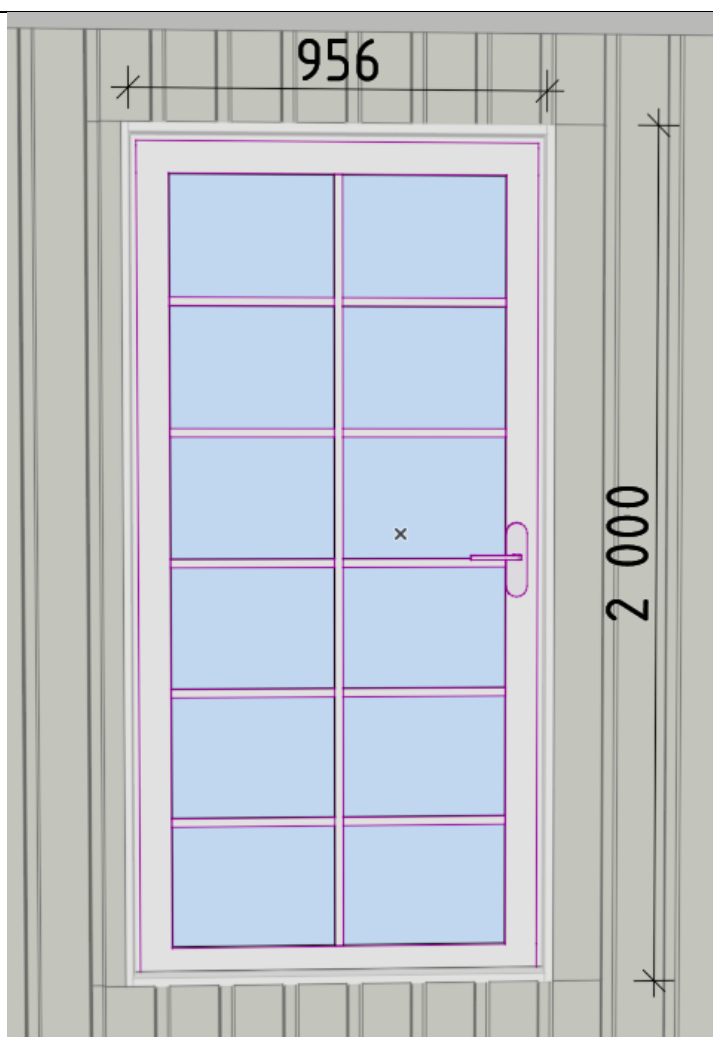


Kapa och klyv till utv. salning fönster & dörrparti ur medföljande 22x120. Kapmått 2 st 22x56 L= 2556 och 2 st 22x56 L=2000. Monteras enl. bild.

Inv salning anpassas efter eget tycke.

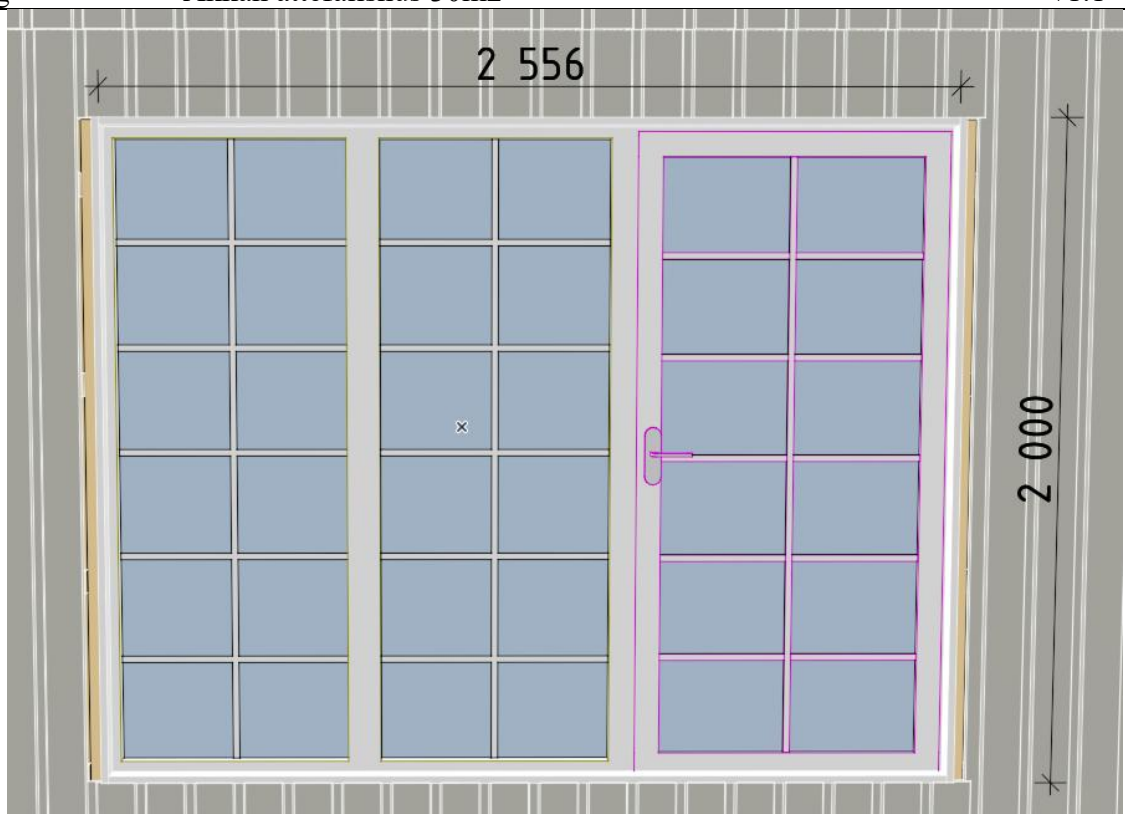


Kapa och klyv till utv. salning fönster ur medföljande 22x120. Kapmått 2 st 22x56 L= 500 och 2 st 22x56 L=456 till utsida monteras enl. bild.


Inv salning anpassas efter eget tycke.

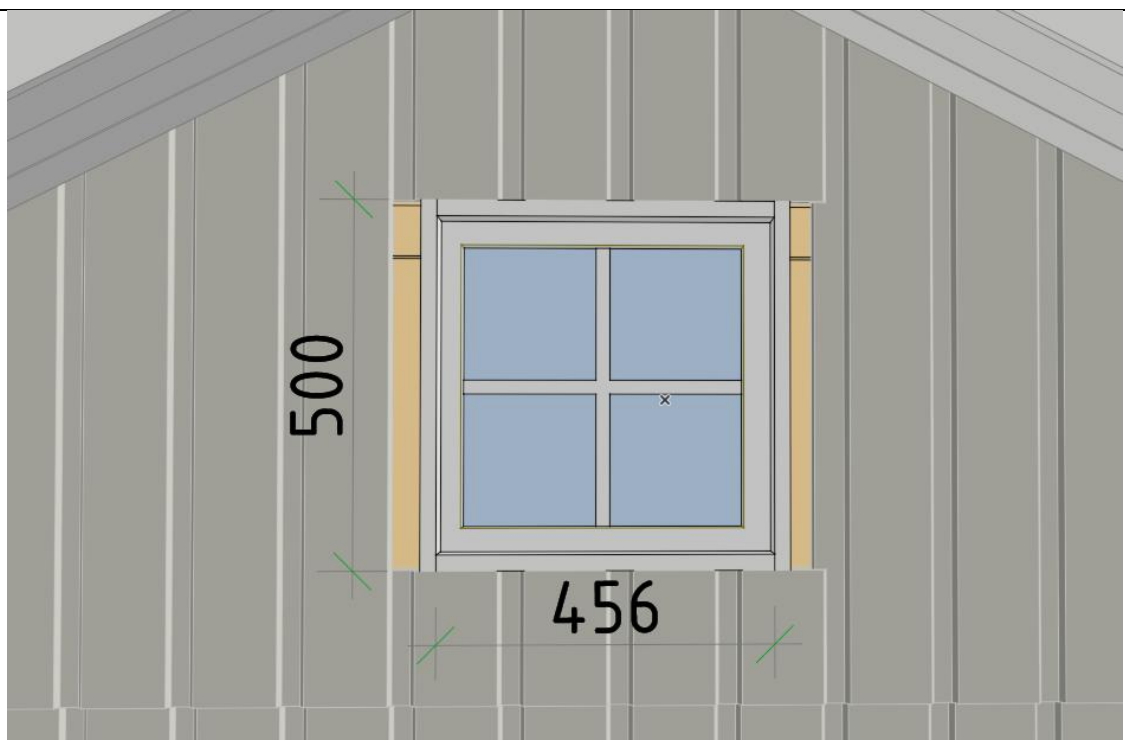

Kapa till och montera foder och knutbrädor.

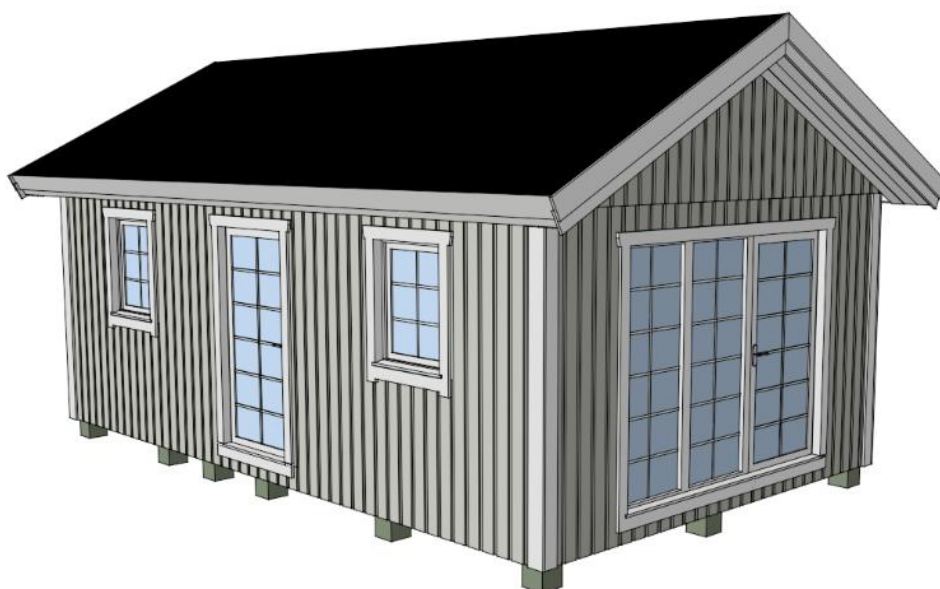


Vy över hörn uppifrån med monterade knutbrädor.

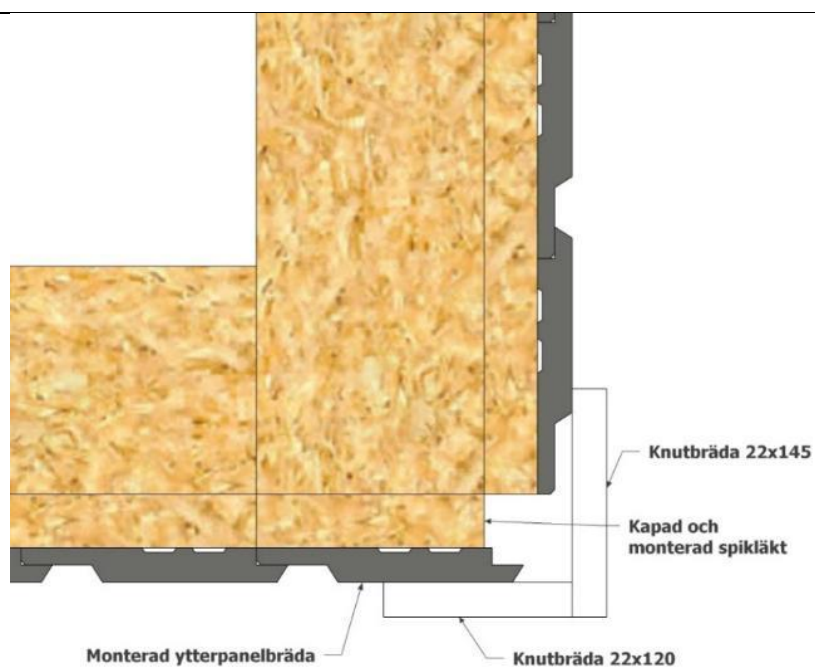


Golv

Vid behov kan extra 45x70 eller 45x95 regler skruvas i golvbjälkarna. Detta för att ge extra stöd till innerväggen och för att kunna skruva innergolvet.

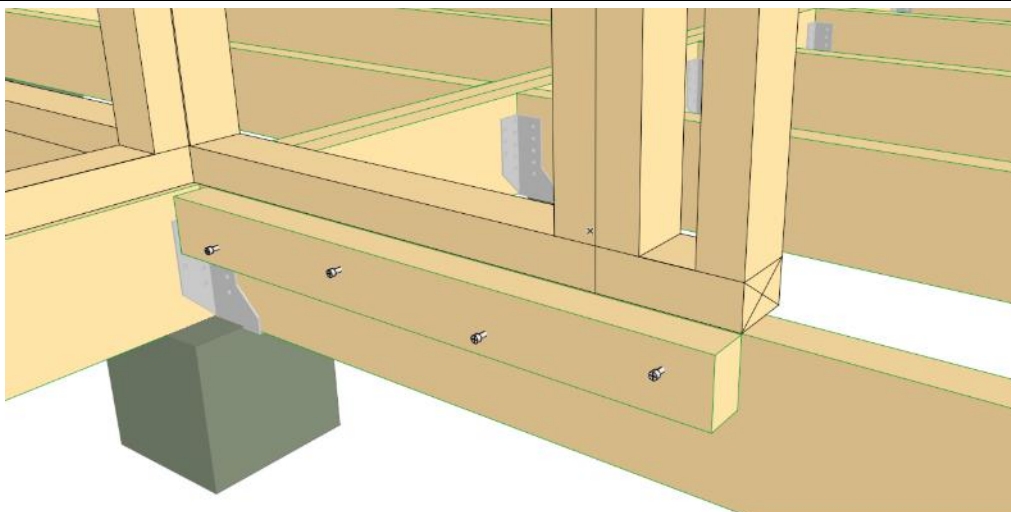

Ett annat alternativ på lösning för att skruva innergolvet är kortlingar av 45x95-virke enligt figur.

Tänk på att lämna lite utrymme för att få ner isolering mellan kortling och golvbjälke.

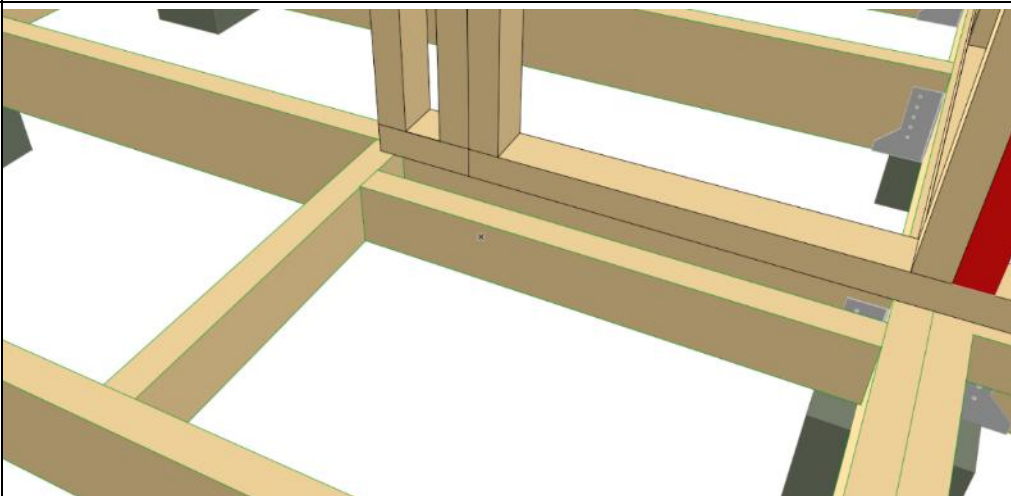

Bilden visar princip på hur isolering av golv och vägg utförs.



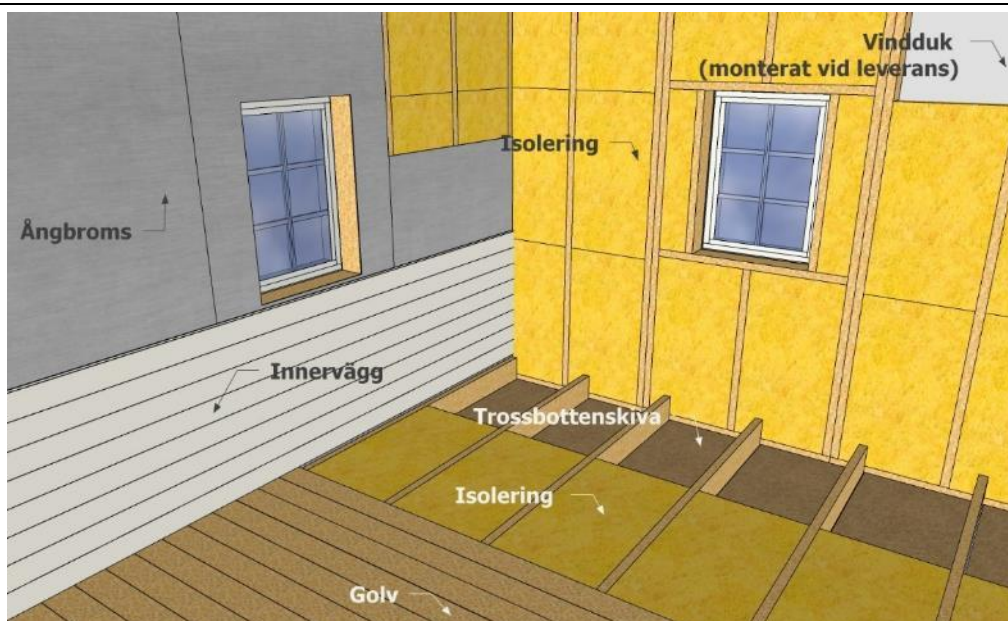


Bild visar princip på isolering av tak.

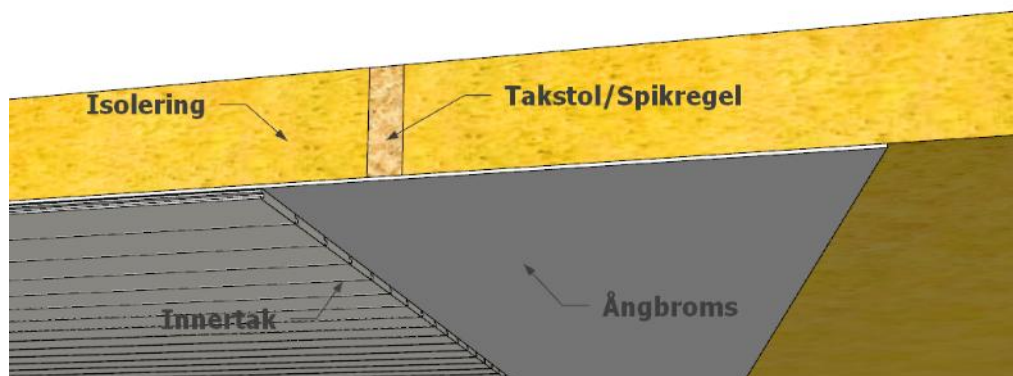

Lägg golvet. Det är ändsponsat och skall skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 5-8mm mot alla 4 väggarna av golvet.

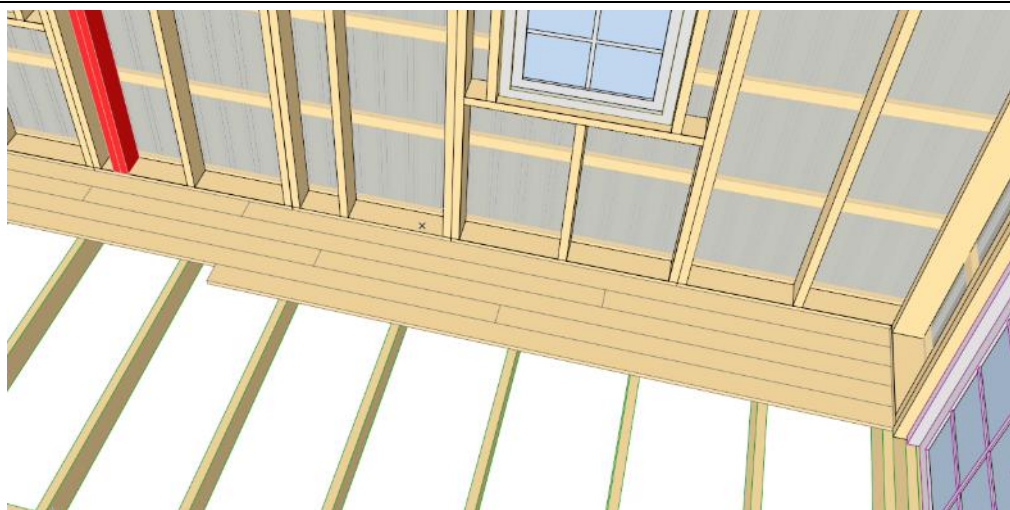

Lägg också golvet på loftet.

Lämna ca 5-8mm mot alla 4 sidor av golvet.



